



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. 9990 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์วง

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

๒๒๙

Switching Deadline

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สค.ขึ้น๓

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตอกเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แฉก ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ จังหวัด สมุทรสาคร	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตอกเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ บริเวณซอยกระเบื้องสีลา	ปลดจุดจัมโบ้โดยวิธีออฟไลน์ กระเช้า ๑๑๕ เควี บริเวณก่อนข้ามคลองมหาชัย	SMC๖YS-๐๗	นายอนุชา คำสีลา โทร.๐๘๑-๗๑๐๗๙-๓๓๓๗๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ผ.ก.ปบ. โทร. ๐๘๑-๗๑๗๕-๕๖๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำрут ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำрут ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำрут
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุขโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สค.ขึ้น๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเคอร์ 115 โวลต์ จาก คคจ. ๖ DDE ถึง SMC645-08  
ในวันที่ 19 ส.ค. ๖๒-๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 360

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ม.โรส. ทองบัว ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อ.ินาจ เทียนทอง

วิฑิต อนุว:๓:  
วค.๖ ปรุงฉบับแทน ชว.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

829

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.คค.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แม่น  
แผนผังแบบ 2 แม่น

มคฟ. (สถานี - )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)


อก.ปบ.(ก.๓)

19 ส.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ซอยกระเบื้องสีลา(สายส่ง 115 เควี บริเวณ DDE ก่อนข้ามคลองมหาชัย ถึง ABS สถานีรถไฟคอกกระบือ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 มี.ค. 62- 8 เม.ย.62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ ตอกเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 360/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนซ์ ทองย้อย วันที่ 17 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. ,นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนการทำสวิตชิง</b>							
<b>เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.</b>							
1	SMC06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
2	SMC06YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.		ABS สถานีรถไฟคอกกระบือ
3	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี(ชุดพ่อนุชา คำสีดา) ทำการปลดจุดจัม 115 เควี บริเวณก่อนข้ามคลองมหาชัย						
4	หลังจากขอทไลน์กระเช้า 115 เควี(ชุดพ่อนุชา คำสีดา) ทำการปลดจุดจัม 115 เควี บริเวณก่อนข้ามคลองมหาชัย						
5	แจ้งพื้นที่ให้ กฟจ.สค. รับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟจ.สค. ปฏิบัติงานได้						
9	SMC06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-
<b>**หมายเหตุ** กฟจ.สค. ทำงานตอกเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ วันที่ 22 มี.ค. 62 ถึง 8 เม.ย. 62</b>							
<b>**เชื่อม DDE บริเวณก่อนข้ามคลองมหาชัย กลับคืนวันที่ 8 เม.ย. 62**</b>							
<b>**** สิ้นสุด Switching วันที่ 22 มี.ค. 62 ****</b>							
10	หลังจาก กฟจ.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จวันที่ 8 เม.ย. 62 พร้อมเชื่อม DDE บริเวณข้ามคลองมหาชัย						
11	SMC06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
14	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี(ชุดพ่อนุชา คำสีดา) ทำการเชื่อมจุดจัม 115 เควี บริเวณก่อนข้ามคลองมหาชัย						
15	หลังจากขอทไลน์กระเช้า 115 เควี(ชุดพ่อนุชา คำสีดา) ทำการเชื่อมจุดจัม 115 เควี บริเวณก่อนข้ามคลองมหาชัย						
16	SMC06YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		สค.		ABS สถานีรถไฟคอกกระบือ
17	SMC06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-
<b>**** สิ้นสุด Switching ****</b>							

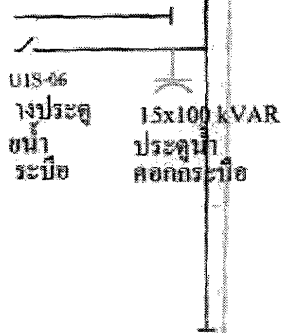

คาน้ำรอกไฟคอกกรระบือ  
SMC6YS-07  
1"6

← พิกัดขั้วดิน

← พิกัดขั้วไฟคอกกรระบือ

1"6<sub>2</sub>

← ขนาคอกกรระบือ 15x100kVAR  
คอกกรระบือ 15x100kVAR  
คอกกรระบือ

SMP6S-03

EKA1S-08  
บ.นอกรระบือ

คอกกรระบือ

คอกกรระบือ


SIA1S-08

สะพานคอกกรระบือคอกกรระบือ

SIK2S-12

สามขนาคอกกรระบือ

● SMC6YS-07

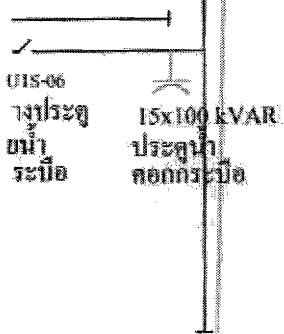

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

SMP6S-03

คลองมหาชัย

EKA1S-08  
บ.ป้อนสินค้า

คลองมหาชัย

SIN1S-08  
สะพานคอกควาหึงโลกขาม

SIX2S-12

สามแยกอัสสัมชัญ
