

866

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป.)- *๒๕๖๒* /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปป. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.ปอพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า อ.ปอพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒๘ มี.ค.๖๒ ๒๙ มี.ค.๖๒ ๓๐ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง เปลี่ยน ขนาดเสาแรงสูง ปักเสาใหม่และ พาดสาย ๑๘๕ ต.มม. (ช่วงที่ ๓)	DIS ชั่วคราว ข้ามสะพาน บ้านยางสูง	DIS ชั่วคราว <i>แจ้ง</i> AVR บ้าน หนองรี BOP๑๕R -๐๓	นายธีร์รัช ฉิมพวัน ชม.กส.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๒-๘๐๘-๑๖๓๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พชง.๒ (สข) โทร. ๐๘๙-๒๑๓๓๒๕๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปป. โทร. ๐๘๒-๒๖๐๘๓๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *บุญชู*
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
(.....รจก.(ท).รักษาการแทน.....)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๑๐๗ SCADA 131๕๐๖

3 มี.ค. 62 1๗ 10:36 น.

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียน.....

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

ผู้ส่ง ๐๖. ๕. ๖๗

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ระบบบ้านขวง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ Boeos จาก Dis ชั่วคราวข้าม ถึง Dis ชั่วครว นวั Ave ข. นนทบุรี
ในวันที่ 28, 29, 30 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 376 / 62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรชัย นอระตา: ประธานงานขอดับไฟกับ นาย กิจจา อินทวารดี

วัชรชัย นอระตา
(วศก.๖ ปฏิบัติแทน นย.๑น.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที.ก.๓ กปบ.(คฟ.)

866 /๒๕๖๒

เรียน ผจก. กฟอ.บพอ.อภ.วอ.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ


สำเนาเรียน สฟพ.



(นาย กิจจา อินทวารดี)

อภ.ปบ.(ก.๓)

21 มี.ค. 2562




ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวข้ามสะพานบ้านยางสูง - Dis ชั่วคราวหลัง AVR บ้านหนองรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28,29,30 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1694/60	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ			วันที่	20 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตชิงตัดตอนภายในสถานี						
2	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		AVR หนองรี
4	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
5	BOP05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOP		-
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
7	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรี
8	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
9	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนรับไฟจาก LWU02						
10	DAA09S-19	ปลด	สับ		หปร.	scada	SF6 ปลักประตู
11	BOP05S-13	สับ	ปลด		หปร.	scada	SF6 แยกหนองปรือ
12	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก BOP04						
13	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สี่แยกหนองปรือ
14	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.		R หนองรี AVR.
15	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น.						
16	BOP5F-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		Drop ไลน์แยกพัฒนา BOP05
17	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		Dis ชั่วคราวหลัง AVR บ้านหนองรี
18	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		Dis ชั่วคราวข้ามสะพานบ้านยางสูง
19	SW BY PASS BOP5R-03	ปลด	สับ		บพล.		SF6 BY AVR บ้านหนองรี (loop
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						Short Ground)
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2						
22	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
23	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
24	BOP05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOP		-
25	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรี
27	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	เมื่อชุดปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
29	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
30	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
31	BOP05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOP		- -
32	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
33	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรี
34	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
35	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
36	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	SW BY PASS BOP5R-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 BY AVR บ้านหนองรี
39	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	ปลด	สับ		บพล.		Dis ชั่วคราวข้ามสะพานบ้านยางสูง
40	ปรับ Tap หม้อแปลง AVR บ้านหนองรี ลงมา Tap 1						
41	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรี
42	ปรับ Tap หม้อแปลง AVR บ้านหนองรี ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
43	BOP5F=10	ปลด	สับ		บพล.		Drop ไลน์แยกพัฒนา BOP05
44	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04						
45	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	ปลด	สับ		บพล.		Dis ชั่วคราวหลัง AVR บ้านหนองรี
46	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 สี่แยกหนองปรือ
47	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก LWU02						
48	BOP05S-13	ปลด	สับ		หปร.	scada	SF6 แยกหนองปรือ
49	DAA09S-19	สับ	ปลด		หปร.	scada	SF6 ปลั๊กประตู
50	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
51	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		AVR หนองรี
52	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
53	BOP05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOP		- -
54	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง
55	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรี
56	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
สิ้นสุด Switching							


สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

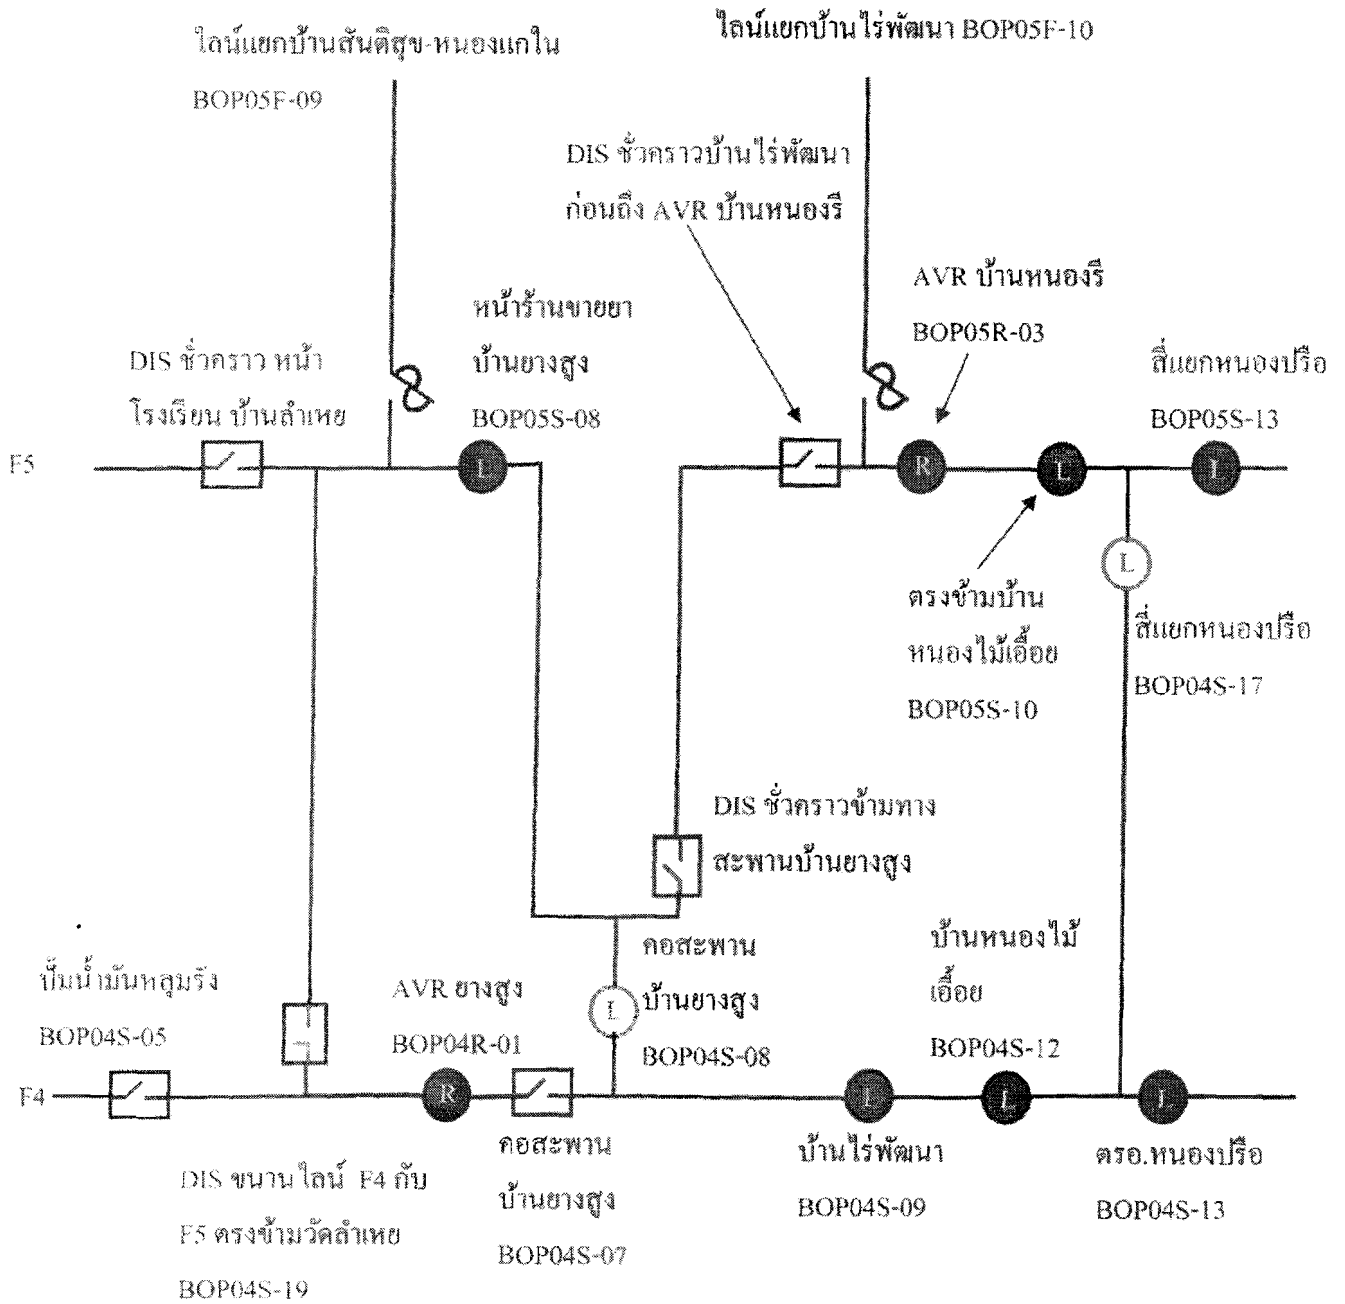

(Handwritten signature)

๑๒ มิถ ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

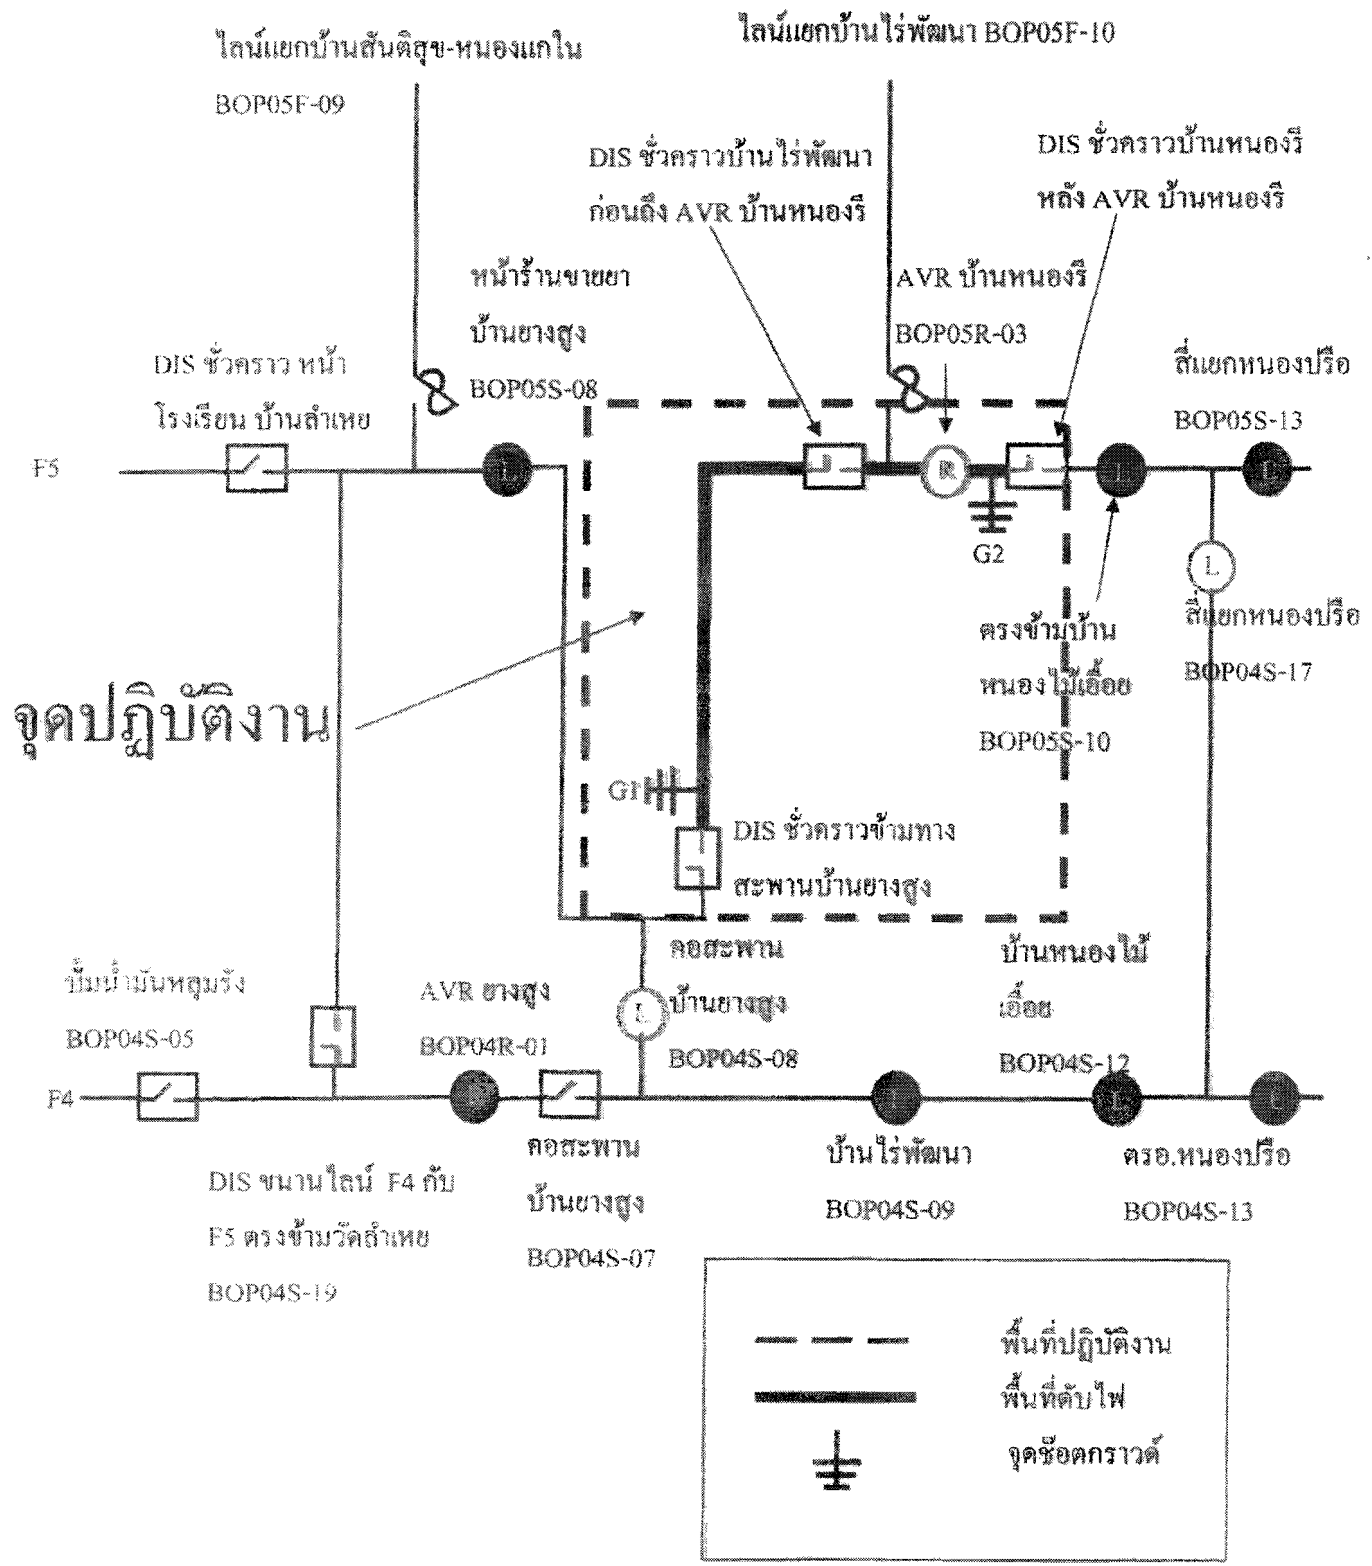


 ๑๕ มีค ๒๕๖๒
