



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- 27 /๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์ ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	27 มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง หรือ ถอนเสาแรง สูง และปัก เสาใหม่ (ช่วงที่ ๒)	DIS ชั่วคราว หน้า โรงเรียน บ้านลำเหย	DIS ชั่วคราว สะพาน บ้านยาง สูง และ DIS Loop วงจร F๔- F๕ ตรง ข้ามวัดลำ เหย BOP๐๔S -๑๙	นายพุดศักดิ์ เห็นประเสริฐ พชง.๗ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เปล่งสงคราม ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๕-๒๕๑๑๙๖๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายภักจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผ.บ.บ. โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป
 ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด



๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ บุญชู
 (นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
 (รจก.(ท.)รักษาการแทน
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒
 ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 เลขทะเบียน.....
 วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

พุดศักดิ์
 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

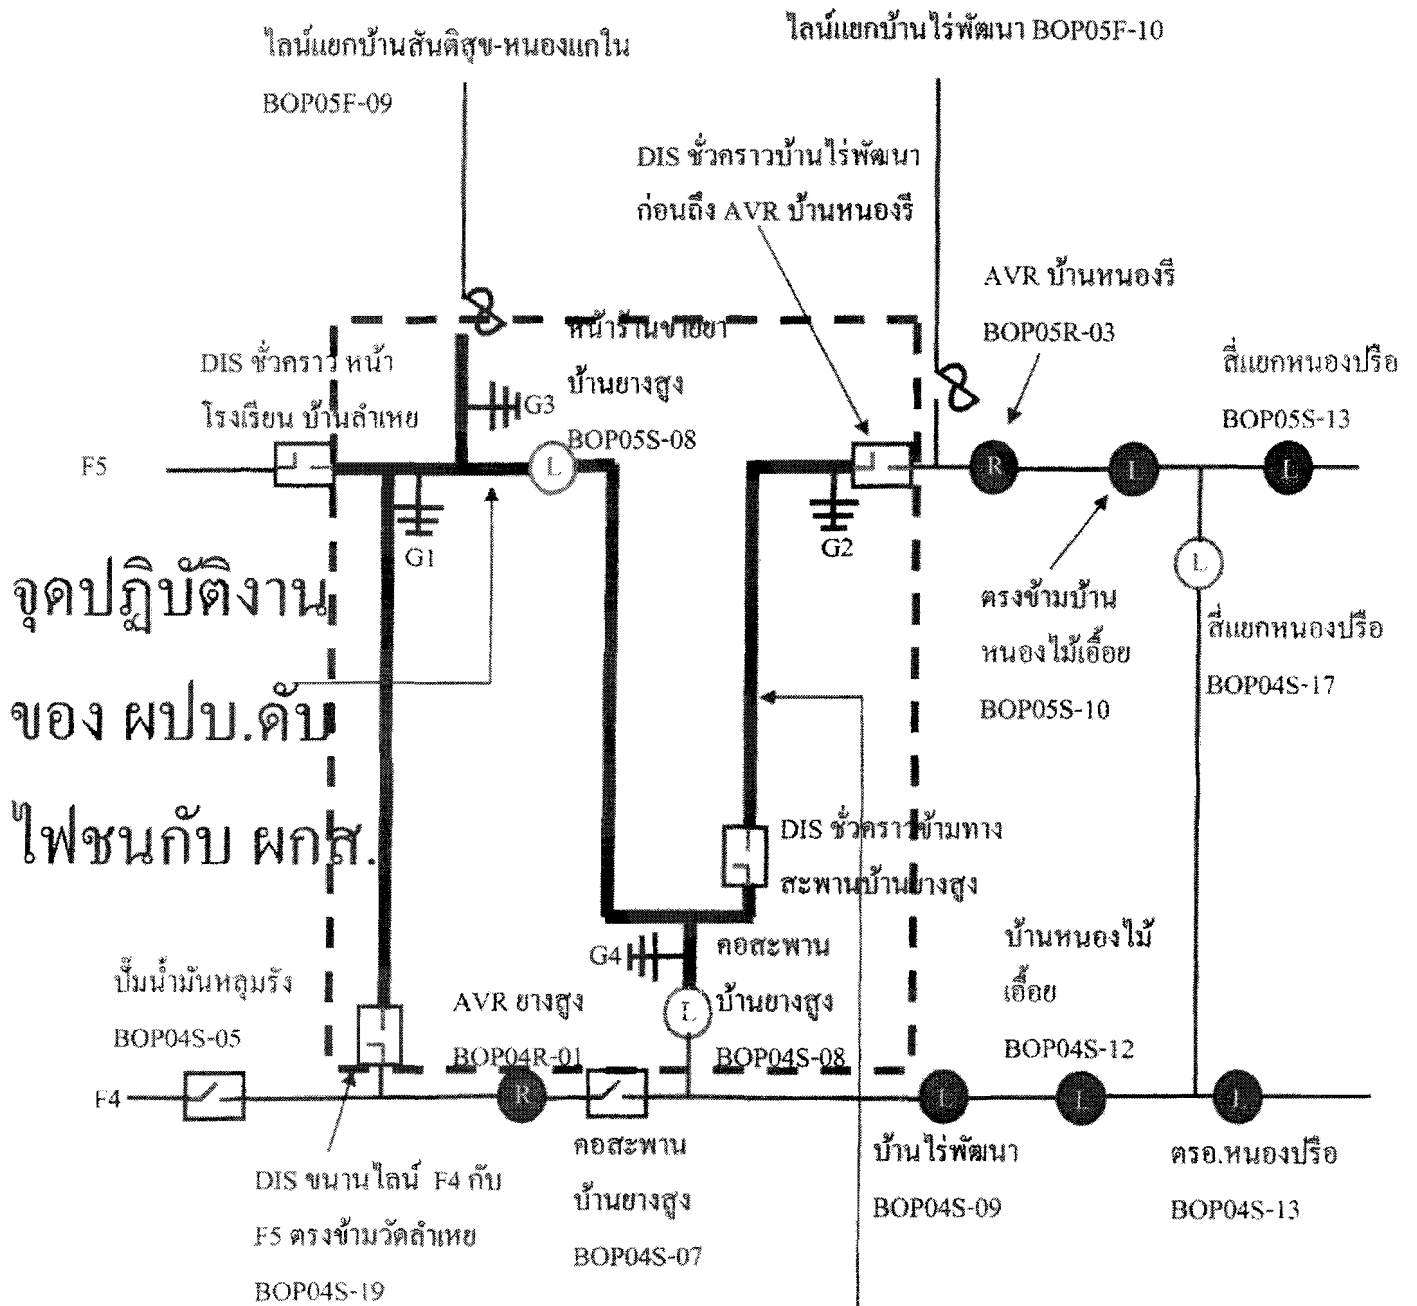
ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านยางสูง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29 มี.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บพล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 371/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริเนียม | | วันที่ 23 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 มี.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 25 มี.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching 29 มี.ค. 62 12.00น.						
2	ดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข						
3	BOP05VB-01	Auto	Manual		BOP	-	-
4	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	SCADA AVR	หนองรีลำอี่ชู
5	Drop ไลน์ BOP5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.	Drop	สันติสุข
6	Drop ไลน์ BOP5	ปลด	สับ		บพล.	Drop	หนองแกโน
7	BOP05VB-01	Manual	Auto		BOP	-	-
8	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.	SCADA AVR	หนองรีลำอี่ชู
สิ้นสุด Switching 29 มี.ค. 62							
1	งานวันที่ 30 มี.ค. 62						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP	-	-
4	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU	-	-
5	BOP05VB-01	Auto	Manual		BOP	-	-
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA AVR	บ้านยางสูง
7	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	SCADA AVR	หนองรี Manual TAPปรับTAP1
8	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
9	ลดโหลด BOP5 บางส่วนจ่ายจาก LWU2						
10	DAA09S-19	ปลด	สับ		หปร.	SCADA SF6	ปลั๊กประตู
11	BOP05S-13	สับ	ปลด		หปร.	SCADA SF6	แยกหนองปรือ
12	ทำ Bypass BOP05R-03						
13	SF6 bypass	ปลด	สับ		บพล.	AVR	หนองรี
14	BOP05R-03	สับ	ปลด		บพล.	AVR	หนองรี
15	ย้ายโหลด BOP5 บางส่วนจ่ายจาก BOP4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
16	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6	สี่แยกหนองปรือ
17	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	ก่อนถึง AVR บ้านหนองรี
18	เมื่อพร้อมดับไฟ							
19	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	หน้า รร.บ้านลำเหย
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ							
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
26	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-	-
27	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-	-
28	BOP05VB-01	Manual	Auto		BOP		-	-
29	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	AVR	บ้านยางสูง
30	LWU02R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
32	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-	-
33	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		-	-
34	BOP05VB-01	Auto	Manual		BOP		-	-
35	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	AVR	บ้านยางสูง
36	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							
41	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS	หน้า รร.บ้านลำเหย
42	ย้ายโหลด BOP5 บางส่วนจ่ายจาก BOP4							
43	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS	ก่อนถึง AVR บ้านหนองรี
44	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6	สี่แยกหนองปรือ
45	นำ BOP05R-03 เข้าระบบ							
46	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing + ALT + GND		บพล.		AVR	ตรวจสอบ Manual TAP ปรับ TAP1
47	SF6 bypass	สับ	ปลด		บพล.		AVR	หนองรี
48	ย้ายโหลด BOP5 กลับจาก LWU2							
49	BOP05S-13	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6	แยกหนองปรือ

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



จุดปฏิบัติงาน
ของ ผปบ.ดับ
ไฟชนกับ ผกส.

จุดปฏิบัติงานของ ผกส.
วันที่ 28,29,30 มี.ค.62

