

1057



## วิญญูขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๕๒๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๑๑ เม.ย.๖๒ ๑๒ เม.ย.๖๒	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐น.	ปรับปรุง เปลี่ยน ขนาดเสาแรงสูง ปักเสาใหม่และ พาดสาย ๑๘๕ ต.มม. (ช่วงที่ ๓)	DIS ชั่วคราว ข้ามสะพาน บ้านยางสูง	DIS ชั่วคราว หลัง AVR บ้านหนอง รี BOP๐๕R -๐๓	นายธีรวัช นิมพวัน ชม.กส.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๒-๘๐๘-๑๖๓๓
๒		๒๖ เม.ย.๖๒ ๒๗ เม.ย.๖๒						

(เจ้าชาย - เอ็น (๐๑กลับ))

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี พูลพจน์ ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๘๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายภักพงษ์ อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)

(..... ผจก.กฟอ.บพล. ....)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ BOP5 จาก DIS ถังหมักที่ ~~สหพันธ์~~ <sup>จาก</sup> ถึง DIU อู่ตวง และ Ave. บ้านหนอง  
ในวันที่ 11, 12 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 435/62


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ BOP5 จาก DIU อู่ตวง ~~ไม่ส่งไฟ~~ <sup>ไปอู่ตวง</sup> ถึง DIU อู่ตวง และ Ave. บ้านหนอง  
ในวันที่ 26, 27 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ทวีสุข ประสานงานขอดับไฟกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  
( นายเกษม ธีรสรณ์ )  
วันที่ 6 เม.ย. ๖๒


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1057 /๒๕๖๒

เรียน ผจก. กฟอ.บพล.ฉก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ





- 5 เม.ย. 2562

( นายเอกชัย หิณสุวรรณ )

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

สำเนาเรียน สฟพ.

## ใบสั่งทำสวิตชิง



1. สถานที่ทำงาน Dis ชั่วคราวข้ามสะพานบ้านยางสูง - Dis ชั่วคราวหลัง AVR บ้านหนองรี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11-12,26-27 เม.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 435/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โชน ทอญ้อย วันที่ 4 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมน โชน, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี</b>							
1	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
2	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		AVR หนองรี
3	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
4	BOP05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOP		-
5	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
6	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรี
7	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
8	<b>** ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนรับไฟจาก LWU02**</b>						
9	DAA09S-19	ปลด	สับ		หปร.	scada	SF6 ปลักประตู
10	BOP05S-13	สับ	ปลด		หปร.	scada	SF6 แยกหนองปรือ
11	<b>** ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก BOP04**</b>						
12	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สี่แยกหนองปรือ
13	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.		R หนองรี
<b>เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น.</b>							
14	D/O ไลน์แยกพัฒนา	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		Drop ไลน์แยกพัฒนา BOP05
15	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		Dis ชั่วคราวหลัง AVR บ้านหนองรี
16	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		Dis ชั่วคราวข้ามสะพานบ้านยางสูง
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2						
19	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
20	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
21	BOP05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOP		-
22	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง
23	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
26	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
27	BOP05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOP		- -
28	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
29	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
32	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	ปลด	สับ		บพล.		Dis ชั่วคราวข้ามสะพานบ้านยางสูง
33	ปรับ Tap หม้อแปลง AVR บ้านหนองรี ลงมา Tap 1						
34	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		หปร.		R หนองรี
35	ปรับ Tap หม้อแปลง AVR บ้านหนองรี ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
36	D/O ไลน์แยกพัฒนา	ปลด	สับ		บพล.		Drop ไลน์แยกพัฒนา BOP05
37	<b>**ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04**</b>						
38	Dis ชั่วคราวไลน์ BOP05	ปลด	สับ		บพล.		Dis ชั่วคราวหลัง AVR บ้านหนองรี
39	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 สี่แยกหนองปรือ
40	<b>**ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก LWU02**</b>						
41	BOP05S-13	ปลด	สับ		หปร.	scada	SF6 แยกหนองปรือ
42	DAA09S-19	สับ	ปลด		หปร.	scada	SF6 ปลักประตู
43	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
44	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		AVR หนองรี
45	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
46	BOP05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOP		- -
47	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง
48	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรี
49	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ตรงข้ามเขาเฉลิมพระเกียรติ
สิ้นสุด Switching							



สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

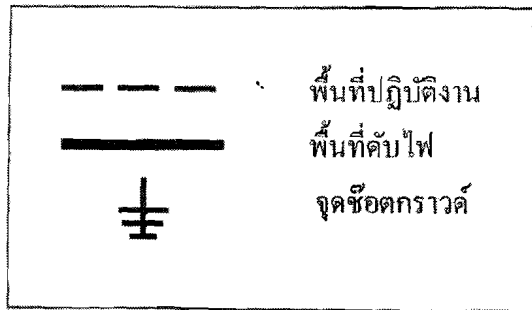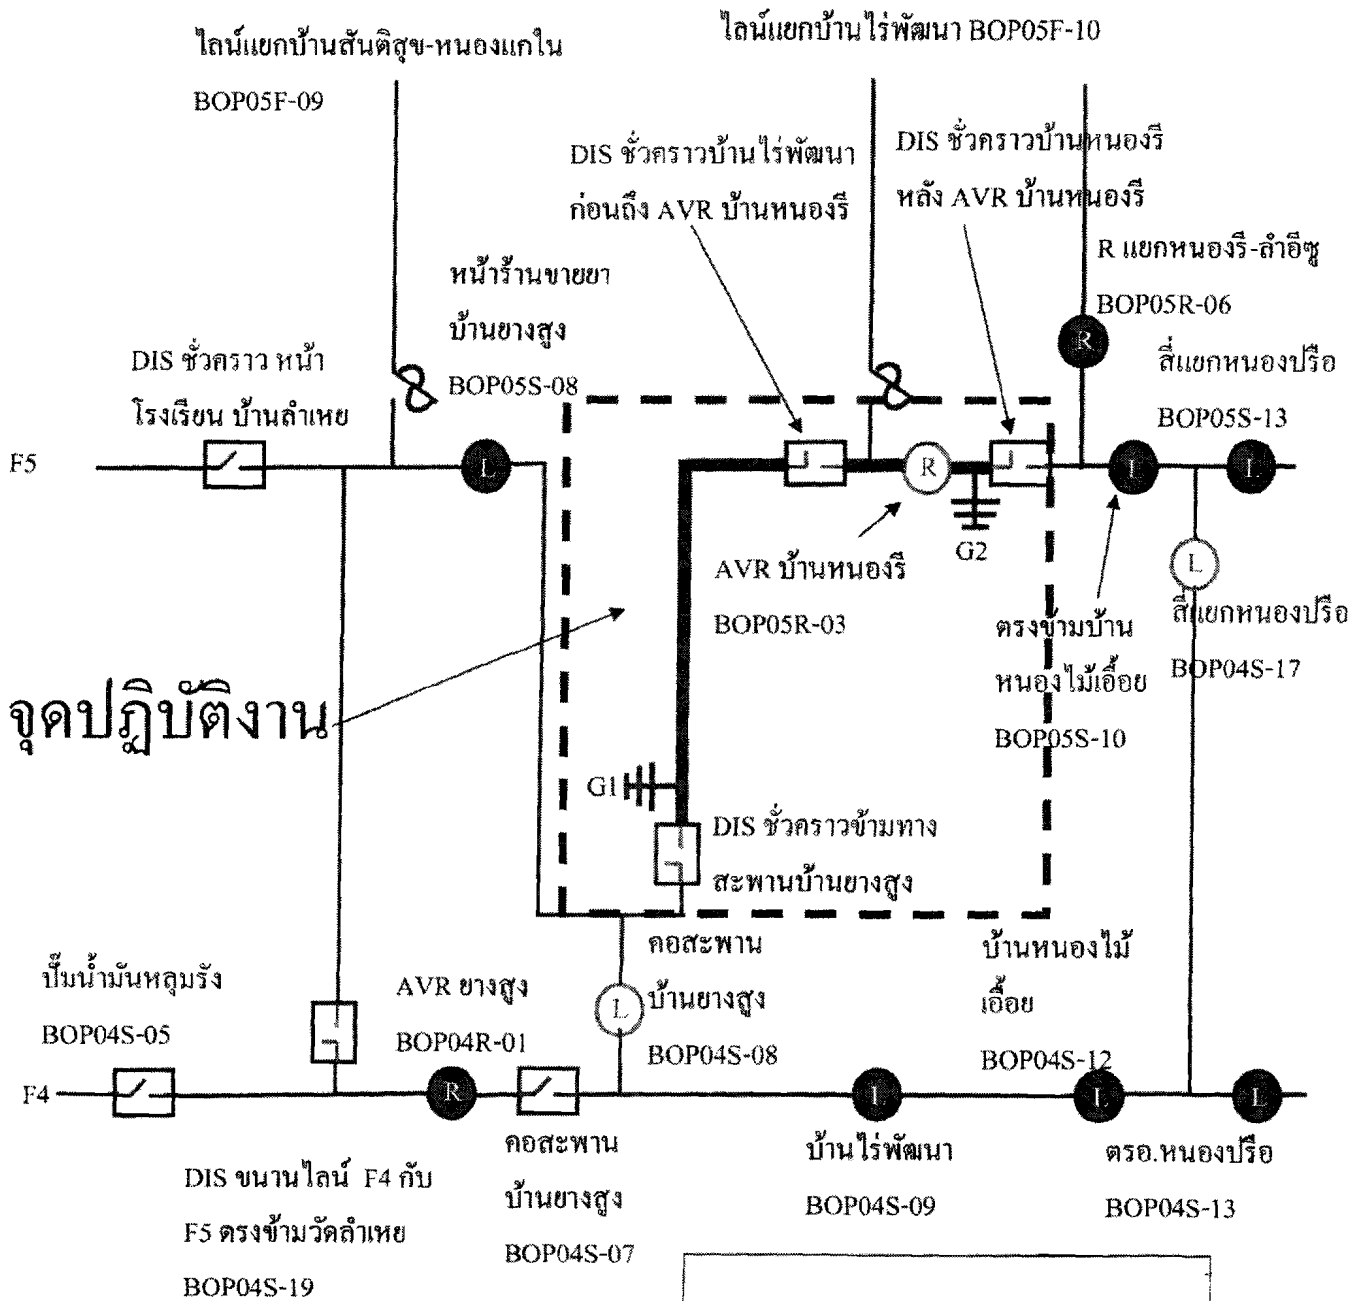

*[Handwritten signature]*
