



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 11 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๘๘๙/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระท่อมแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานฮอทไลน์ฉีดน้ำล้างระบบสายส่ง ๑๑๕.๕เควี...ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD ๔YB-๐๑	๑๒ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ฉีดน้ำ ล้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ใน ระบบ กฟภ. และลูกค้ารายสำคัญ ของ กฟอ.กทบ. บริษัท เซ้าท์อีสท์เทคโซลส์ จำกัด	KTD ๔YB-๐๑	KTD ABS ๔YS-๐๔ SAA ABS ๓YS-๐๔	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๑. ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก KTD 4YB-01 ถึง SAA 3YS-04
KTD 4YS-04

ในวันที่ 12 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 500/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัชชัย นอร์ตะ: ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

รัชชัย นอร์ตะ:
(๖๓๖.๖ ปฏิบัติงานแทน ๖๐-๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ช่วง สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 - ABS 115 เควี SAA03YS-04 ร่มสีทอง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 เม.ย. 62 | ระหว่าง 09.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กทบ. | งานที่ทำ ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 500/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสิทธิชัย หอระตะ | | วันที่ 11 เมษายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
กทบ. | | วันที่ 11-04-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 11 เม.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ Close Loop 115 เควี สฟ.สามพราน 1 SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01 จ่าย Close Loop ปกติ						
2	Open Loop SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01						
3	KTD04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
6	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
7	เมื่อพร้อมดับไฟ 09.00 น.						
8	แจ้ง บ.เซาท์อีส ให้ปลดโหลดภายในโรงงานออกทั้งหมด						
9	หลัง บ.เซาท์อีส ปลดโหลดภายในโรงงานออกทั้งหมด						
10	KTA03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KTD04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS หน้า บ.เซาท์อีส
12	SAA03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS ร่มสีทอง
13	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี Test ไฟ แล้วปฏิบัติงานได้						
14	KTA03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
15	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	KTA03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
18	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
19	SAA03YS-04	ปลด	สับ		กทบ.		ABS ร่มสีทอง
20	KTD04YS-04	ปลด	สับ		กทบ.		ABS หน้า บ.เซาท์อีส
21	แจ้ง บ.เซาท์อีส สามารถนำโหลดเข้าได้ปกติ						
22	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTD04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTA03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%							

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณบริษัท เข้าวัดอีสเท็กซีโกลด์ จำกัด
 ปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 เพื่อให้ขอลดแรงดันกระแสเข้า ๑๑๕ เควี ลดน้ำล้างอุปกรณ์ระบบ ๑๑๕ เควี ในระบบจำหน่ายของ กฟภ.
 และของลูกค้ารายสำคัญ บริษัท เข้าวัดอีสเท็กซีโกลด์ จำกัด

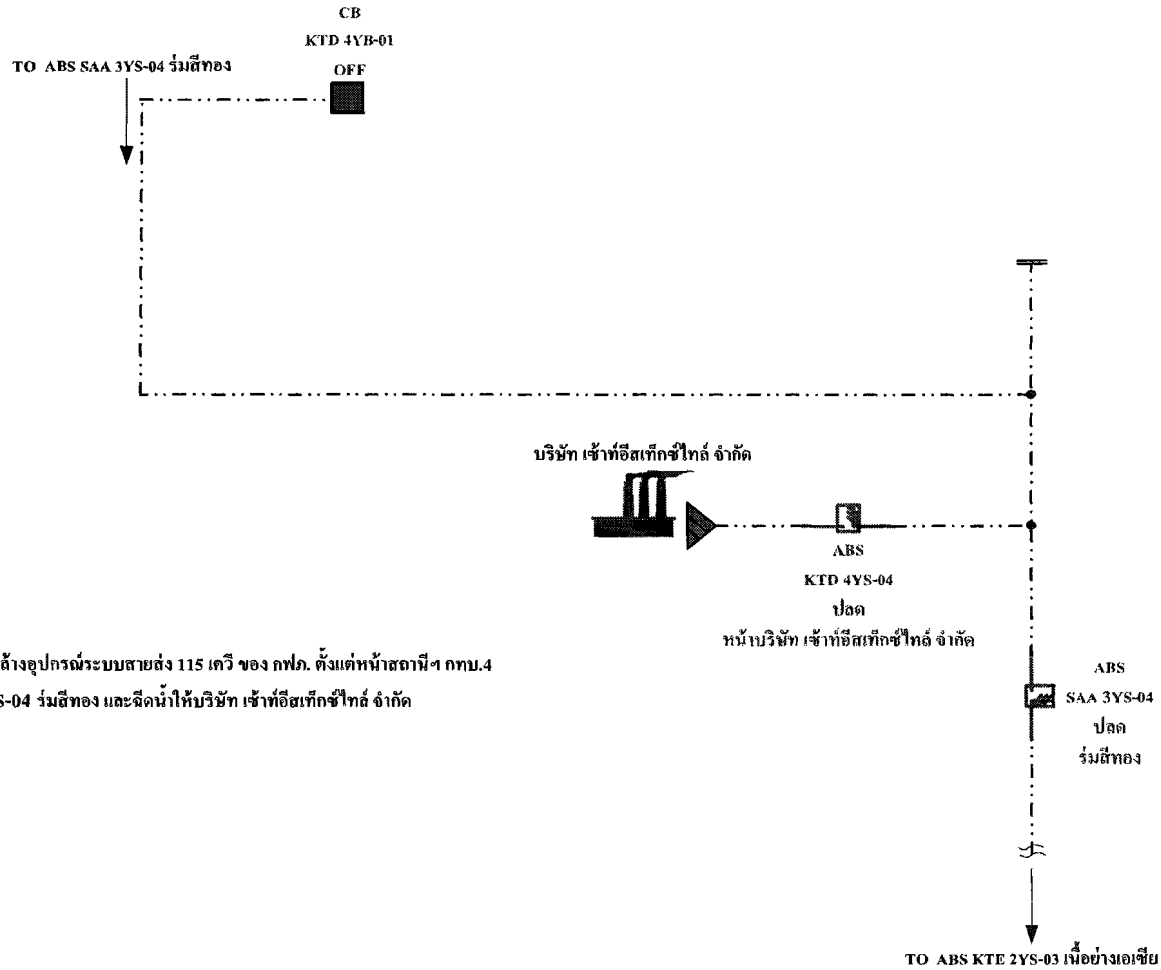

หมายเหตุ
 ออกไลน์กระแสเข้าจะลดน้ำล้างอุปกรณ์ระบบสายส่ง 115 เควี ของ กฟภ. ตั้งแต่หน้าสถานีฯ กทบ.4
 ถึง ABS 3YS-04 ร่มสีทอง และลดน้ำให้บริษัท เข้าวัดอีสเท็กซีโกลด์ จำกัด

แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณบริษัท เช้าที่อีสเท็กซีโกลด์ จำกัด
 ปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 เพื่อให้ขอตไลน์กระแสเข้า ๑๑๕ เควี ฉีดน้ำล้างอุปกรณ์ระบบ ๑๑๕ เควี ในระบบจำหน่ายของ กฟผ.
 และของลูกค้ายารสำคัญ บริษัท เช้าที่อีสเท็กซีโกลด์ จำกัด

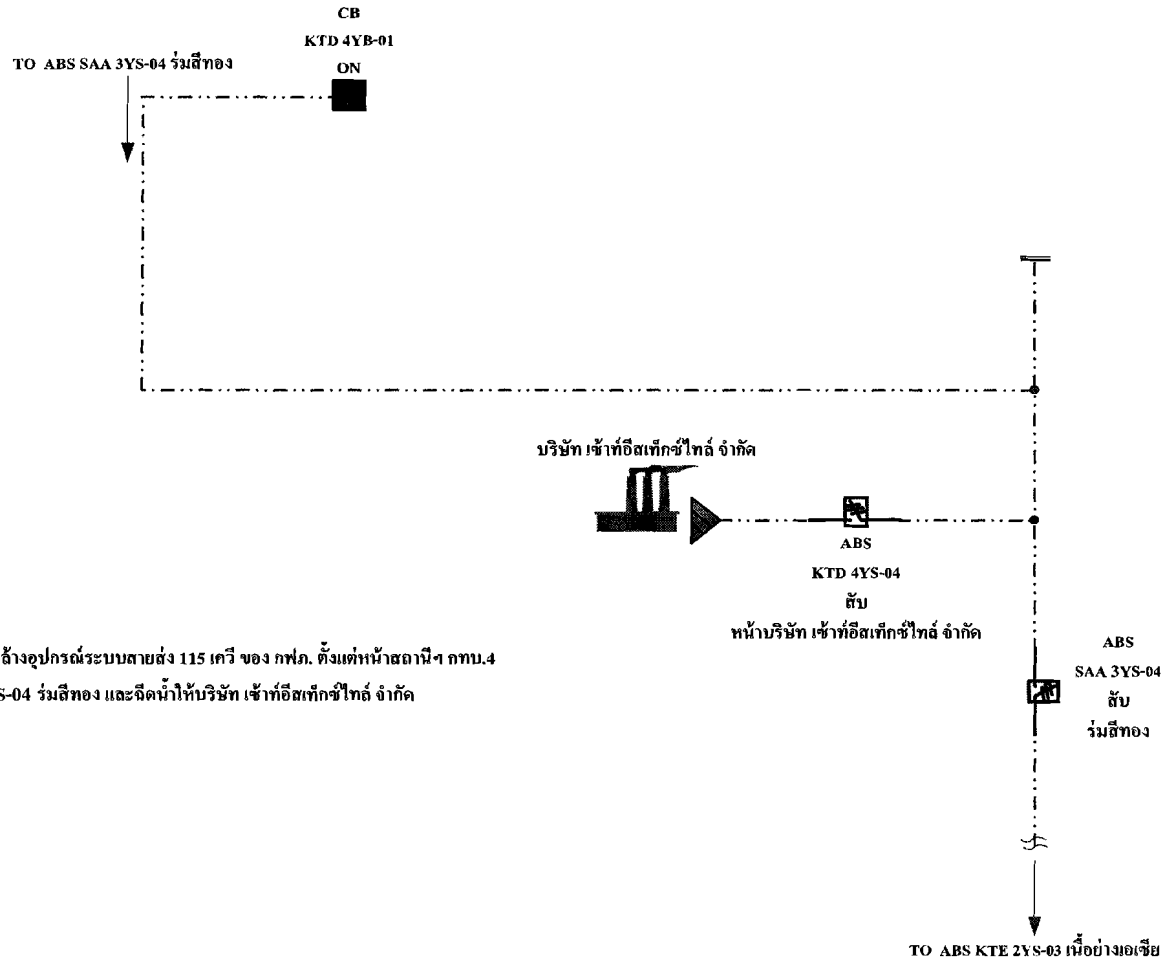

หมายเหตุ ขอตไลน์กระแสเข้าจะฉีดน้ำล้างอุปกรณ์ระบบสายส่ง 115 เควี ของ กฟผ. ตั้งแต่หน้าสถานี-1 กทบ.4
 ถึง ABS 3YS-04 ร่มสีทอง และฉีดน้ำให้กับบริษัท เช้าที่อีสเท็กซีโกลด์ จำกัด
