



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 10 พ.ค. 62

เลขที่ 0.๓.สปท.(ปบ.) **2186**
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงศ์พิณฑ
ชื่อผู้ส่ง นายอนุสรณ์ บุญศิริ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง และติดตั้งSF๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๓	๑๒ พ.ค.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซม DIS NCA๑๐S-๑๒ และ ติดตั้ง SF๖ โลင်း F๓ ๑ ชุด	จุดจัม PG	Disชั่วคราวหลัง มิเตอร์แบ่งแดน	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙๙-๘๘๘๖๒๕๙
๒	SAC๐๔					จุดจัม PG	NCA๑S-๑๓	


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนสาย ๗ ถึงสี่แยกแพศรีวิชัย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายอนุสรณ์ บุญศิริ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ SAC3 จาก จุดจัม PG ๒๓๖๖๗ ถึง Dis ๓๓. น.บ.๑๒๐๕๒๒๕๙
ในวันที่ 12 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ SAC7 จาก จุดจัม PG ถึง NCA1S-19
ในวันที่ 12 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ บุญศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณวัลลภ สุวรรณศรี
3 พ.ค. 62
น. 2
ศทพร อดิศักดิ์
(๐๙๖.6 กกน พว.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

1294

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๓พร. กฟอ.๓พร.

อ.ก.บข.(ก.๓) / อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นางสาวอรุณา คักดีพิณฑ)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

7/5/62

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	Dis NCA10S-12 ถนนพหลโยธินสาย 7				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-พ.ค.-62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ซ่อมแซม Dis และติดตั้ง SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	566/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	6 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>รณพร</i>			วันที่	6 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7/5/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAC03VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 5.1 MW
5	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 0.1 MW
6	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 0.9 MW
7	NCA05VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 2.3 MW
8	ย้ายโหลด SAC03 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA01						
9	NCA01S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 โรงงานดัชมิลล์
10	NCA05S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
11	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		Dis หลังมิเตอร์จุดแบ่งแดน
12	NCA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
13	เมื่อนำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
14	NCA01S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 แยกแพศรีวิชัย วงจรบน
15	แจ้งช่างหน้างานให้ไลน์โหลดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานออก						
16	แจ้งชุด Hotline ทำการปลดจุดจัมป์ไลน์แยกเข้าถนนพหลโยธินสาย 7 ในไลน์ SAC03VB-01 และ SAC09VB-01 ออก						
17	เมื่อชุด Hotline ทำการปลดจุดจัมป์ไลน์แยกเข้าถนนพหลโยธินสาย 7 ในไลน์ SAC03VB-01 และ SAC09VB-01 ออกแล้วเสร็จ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
22	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
23	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
24	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	SAC03VB-01	Manual	Auto		SAC		
26	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		
27	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		
28	NCA05VB-01	Manual	Auto		NCA		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อช่างพนักงานติดตั้ง SF6 ปากทางพหุสมณทลสาย 7 และแก้ไข Dis NCA10S-12 แล้วเสร็จ						
30	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคคาน และ Dis NCA10S-12 ให้อยู่ในตำแหน่ง เปิดวงจร						
31	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
32	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
33	SAC03VB-01	Auto	Manual		SAC		
34	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		
35	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G4 แจ้งชื่อ.....เวลา.....น.						
40	แจ้งชุด Hotline ทำการจัมป์ไลน์แยกเข้าถนนพหุสมณทลสาย 7 ในไลน์ SAC03VB-01 และ SAC09VB-01 เข้า						
41	เมื่อชุด Hotline ทำการจัมป์ไลน์แยกเข้าถนนพหุสมณทลสาย 7 ในไลน์ SAC03VB-01 และ SAC09VB-01 เข้าแล้วเสร็จ						
42	NCA10S-12	ปลด	ล๊ับ		สพร.		Dis ปากทางพหุสมณทลสาย 7
43	Dis ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		นช.		Dis หลังมิเตอร์จุดแบ่งแดน
44	ย้ายโหลด SAC03 บางส่วนกลับจาก NCA01						
45	SF6 ติดตั้งใหม่	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 ปากทางพหุสมณทลสาย 7
46	NCA01S-12	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 โรงงานดัชมิลล์
47	NCA01S-19	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		นช.		SF6 แยกแพคศรีวิชัย วงจรบน
48	NCA01S-18	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		Dis ก่อนแยกแพคศรีวิชัย
49	หมายเหตุ - กพอ.สามพรานจะทำการรื้อถอน Dis ชค.หลังมิเตอร์แบ่งแดน ในไลน์ SAC03VB-01						
50	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
51	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
52	SAC03VB-01	Manual	Auto		SAC		
53	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		
54	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		
55	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 12 พค.62 สาย 7 ด้านไฟแพศรีวิชัย

ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

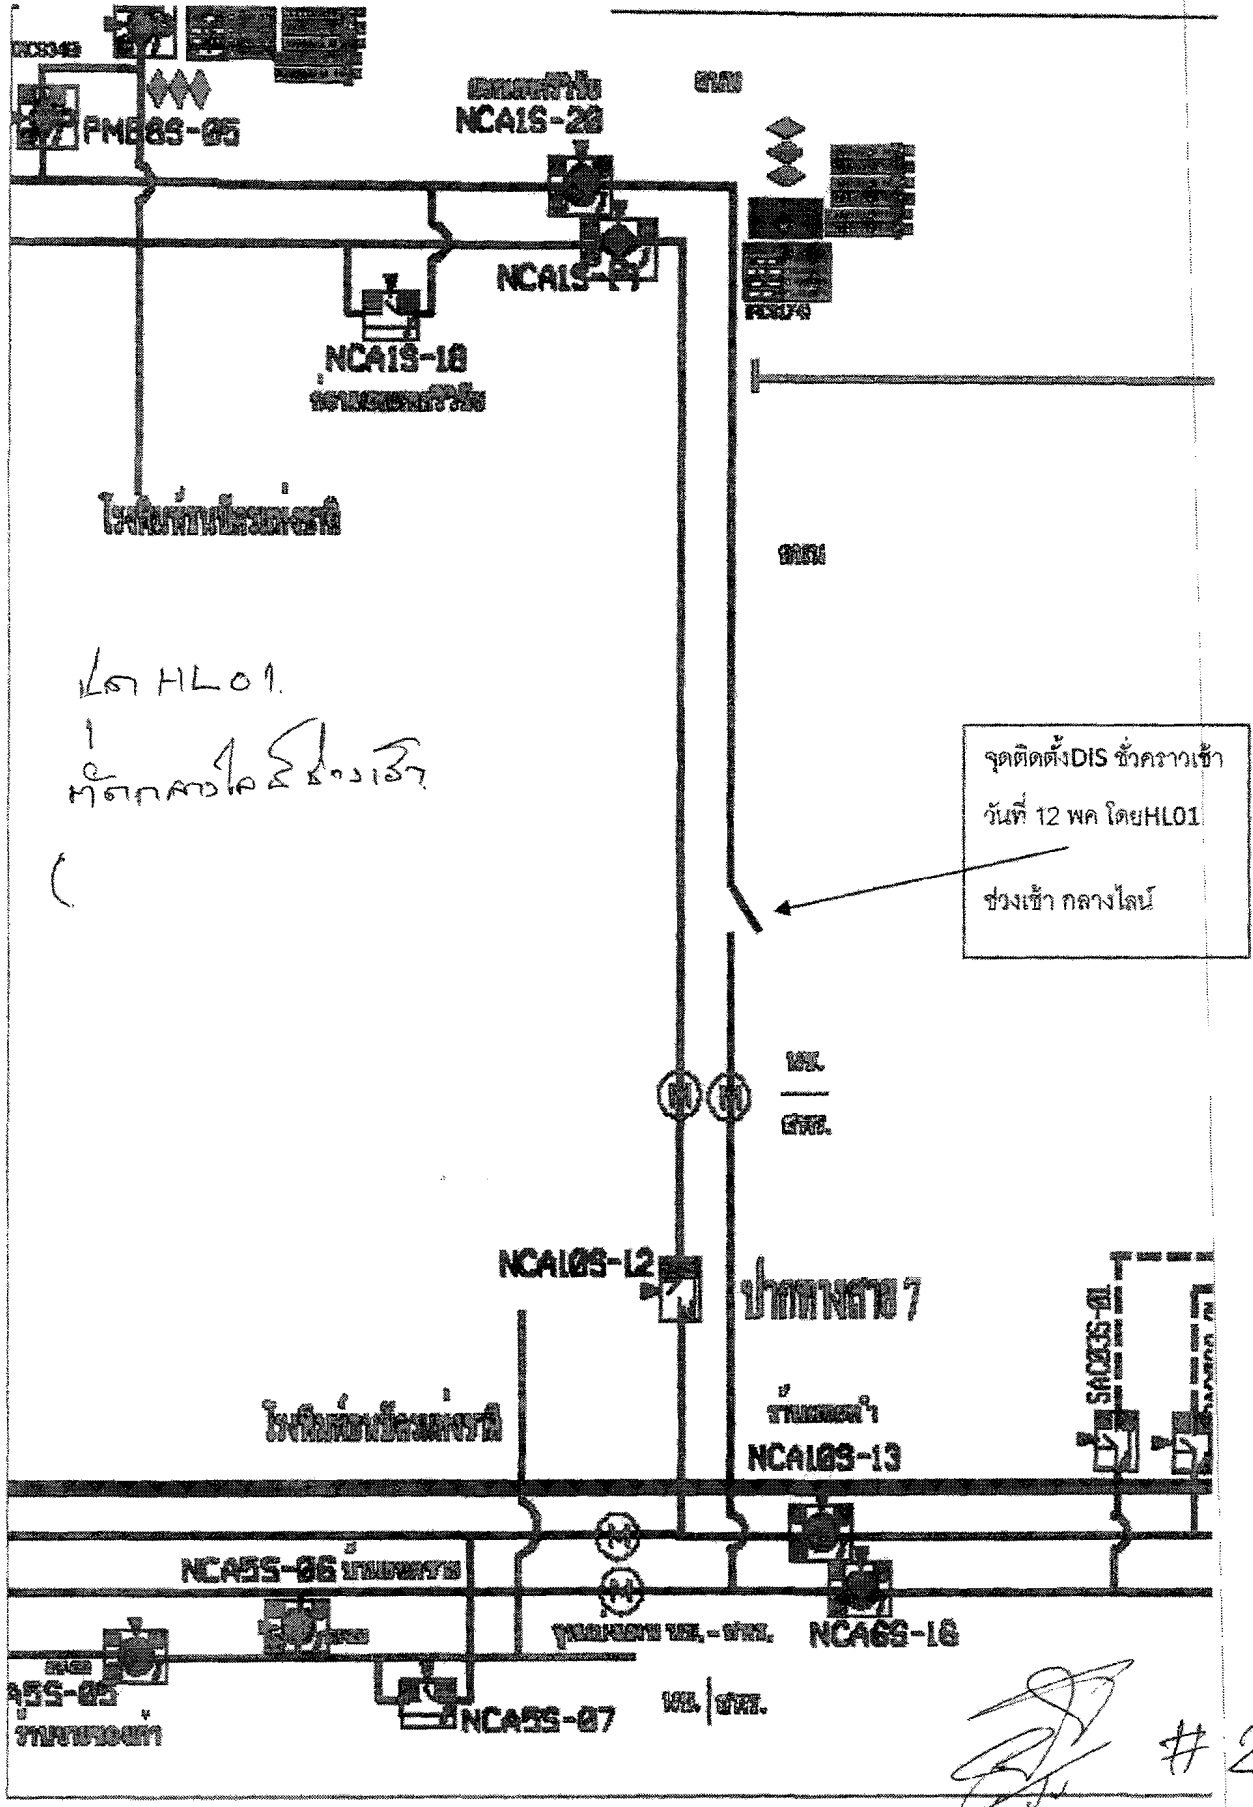


จุดติดตั้ง DIS ชั้นคราเข้า
วันที่ 12 พค โดย HLO1
ช่วงเข้า กลางไลน์

ไลต์ HLO1
หักกลางไป 2 โวลต์

[Signature]
2

งานดับไฟวันอาทิตย์ ที่ 12 พค.62 สาย 7 ด้านไฟแพควีวีชัย

ที่
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

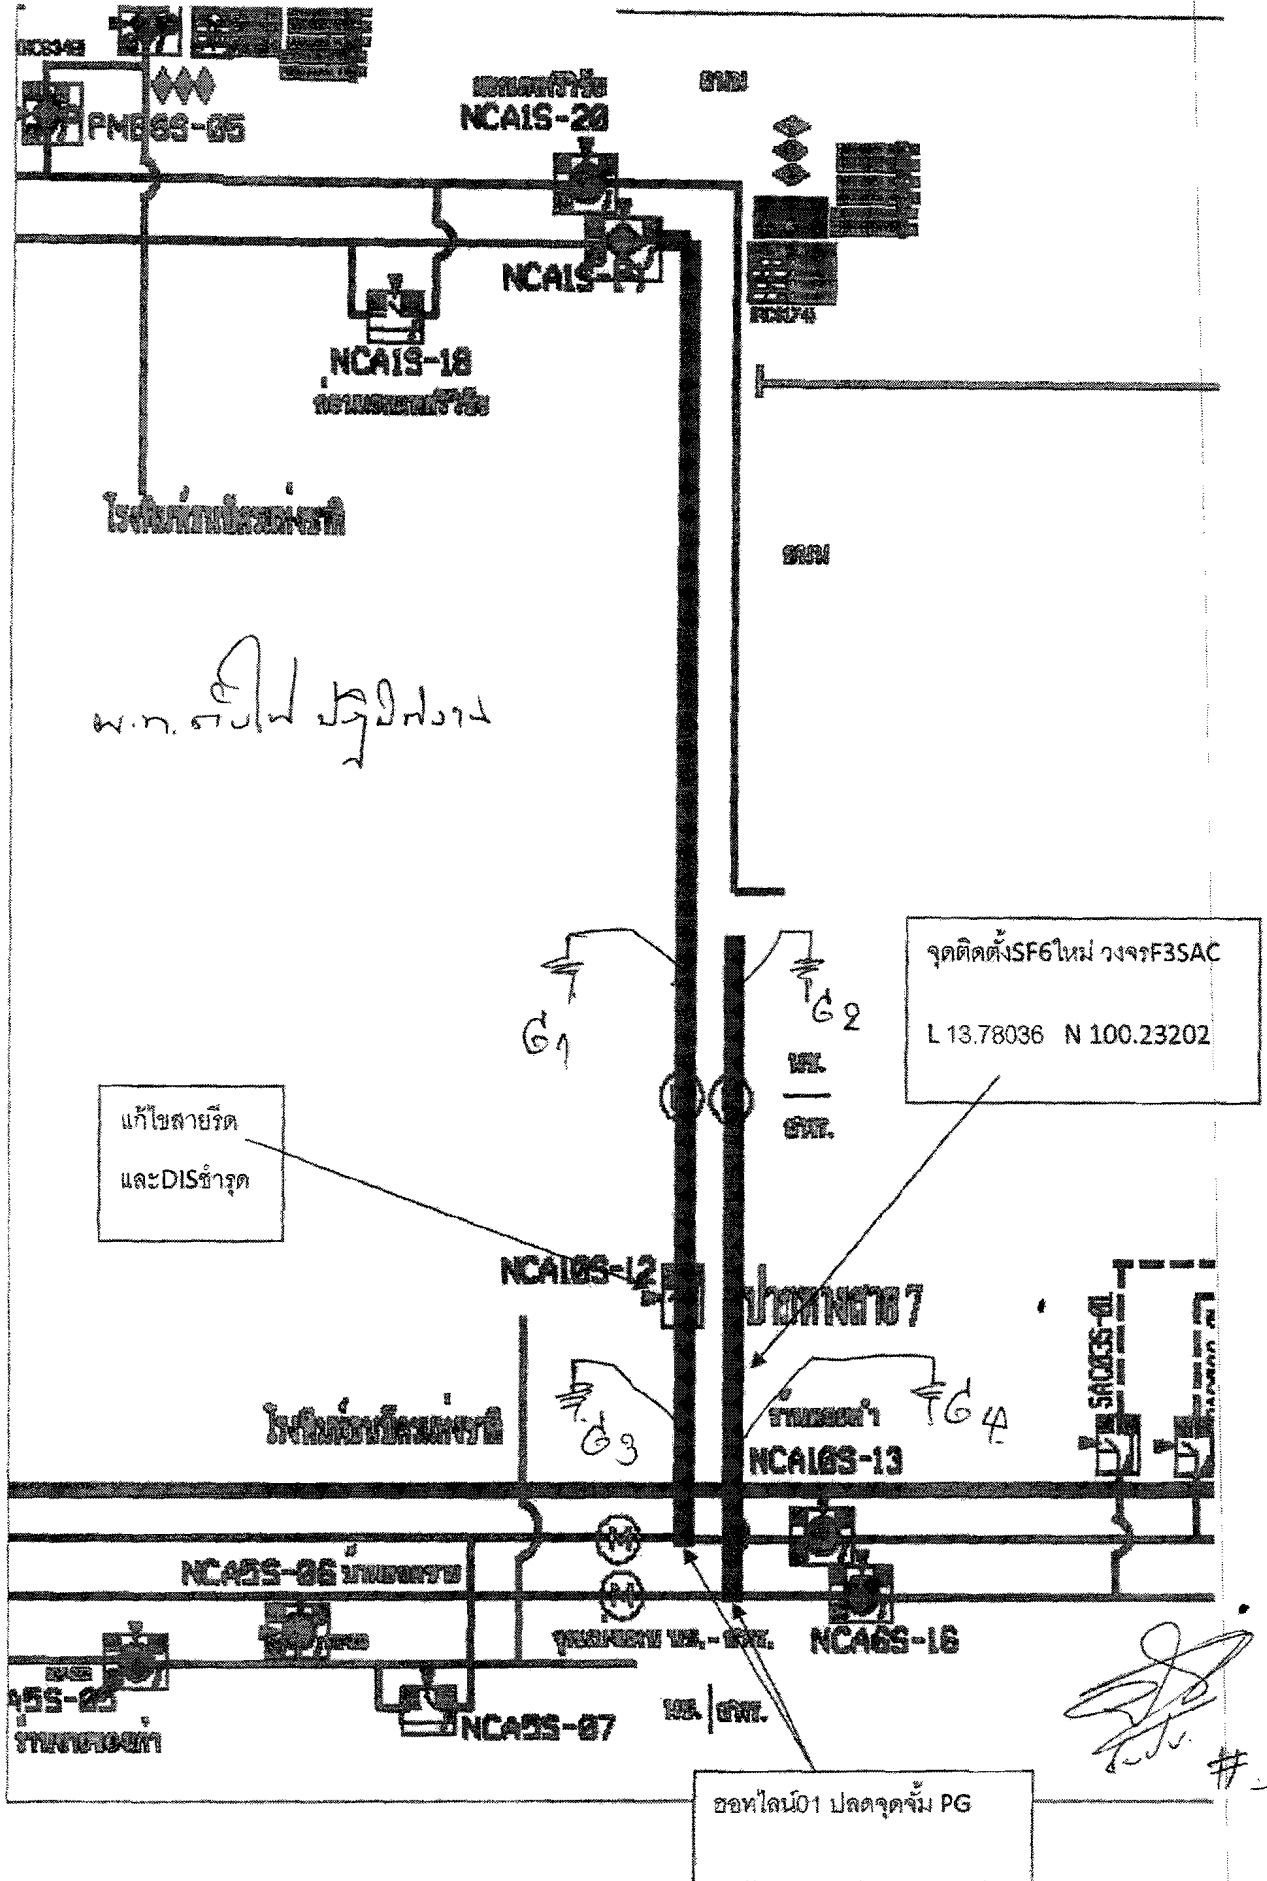

พ.ท. สิบไฟ ปฎิบัติงาน

แก้ไขสายวัด และDISชำรุด

จุดติดตั้งSF6ใหม่ วงจรF3SAC
L 13.78036 N 100.23202

ขอท่ไลน์01 ปลดจุดจัม PG

[Signature]
#3
