



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 10 พ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สค.๒(บ.น.) ๑๑๖๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ค.(ข) กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF.๖ จำนวน ๔ หมายเลขงาน
ในเขตพื้นที่ กฟย.ค.คลองตัน พีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
04 บ้านแพ้ว	วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค.62.	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้ง SF.6 จำนวน 4 จุด	DKS.ร้านประกายเพชร (BNP 04S-10)	สุดไทรระบบจำหน่าย BNP04S-11 ร้านเจย์	นายพัฒนา เก่งน้อย พง.7 ผกส. 089-9117370

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ค.คลองตัน / ค.เกษตรพัฒนา.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนาภิบาลย์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรชัย แก้ววิจิตร)

ตำแหน่ง ร.จ.ค.(ข) กฟจ.สค.๒ (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ BNP04 จาก BNP4S-1๐ ถึง BNP4S-11 ค.ค.ร.บ.บ.บ้านแพ้ว
ในวันที่ 12 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 56๕/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นายไพโรจน์ หอยชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนาภิบาลย์

วิเศษ นอระตะ
(วค.ป.กิจบริหารเทคโนโลยี.สง.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1315

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.คค.๒(คฟ.) กฟย.ค.ค.ค.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


10 พ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ร้านประกายเพชร- สุดระบบจำหน่าย-ร้านเจย์ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 พ.ค. 62 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค.2(บพว.) | งานที่ทำ ติดตั้ง SF6 ใหม่ 4 จุด | ตามใบขอปฏิบัติงาน 567/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมน โชน ทงย้อย | | วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 9 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมน โชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.							
1	BNP04R-01	ปลด	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	ประตูน้ำบางยาง
2	BNP04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คลต.	DIS	ประกายเพชร
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2(บพว.)ทราบ						
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
9	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้ * หมายเหตุ * 1F6 รหัส BNP4S-11 อยู่ตำแหน่ง OPEN หรือสั่งงาน *						
10	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คลต.	SCADA	R ประตูน้ำบางยาง
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
11	หลังจาก กฟจ.สค.2(บพว.) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
12	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ตรวจสอบ SF6(ติดตั้งใหม่) จุดที่ 1 บริเวณร้านเอกธารรงค์ และ SF6(ติดตั้งใหม่) จุดที่ 3 บริเวณ รพ.บ้านแพ้วเกษตรพัฒนา อยู่ตำแหน่งสับ ไชว์ ON(ตามแผนผังแนบ)						
12	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ตรวจสอบ SF6(ติดตั้งใหม่) จุดที่ 2 บริเวณป้อมตำรวจหนองไข และ SF6(ติดตั้งใหม่) จุดที่ 4 บริเวณแยกบ้านก้านอิทธิพล อยู่ตำแหน่งสับ ไชว์ OPEN(ตามแผนผังแนบ)						
13	BNP04R-01	ปลด	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	ประตูน้ำบางยาง
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
19	BNP04S-10	ปลด	สับ		คลต.	DIS	ประกายเพชร
20	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คลต.	SCADA	R ประตูน้ำบางยาง
สิ้นสุดสวิตชิง							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

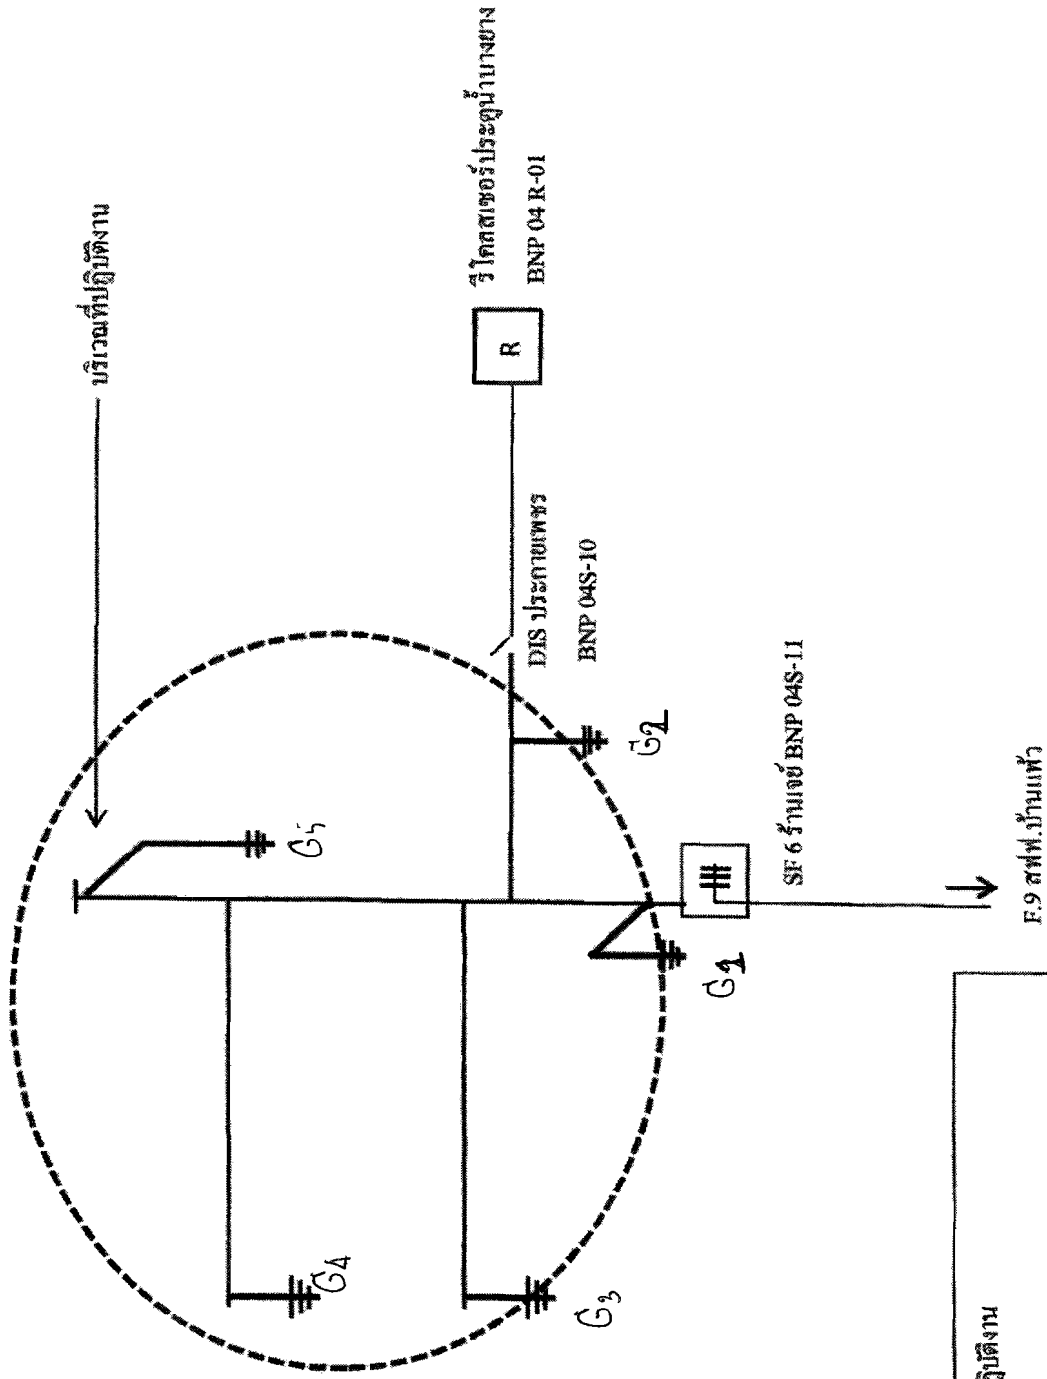

— เส้นที่แสดงพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน
 ≡ ตำแหน่งจุดยึดกราวด์

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ผู้ควบคุมงาน นายพัฒนา แก่นน้อย พงษ์.๗ ผกส.โทร ๐๘๙-๙๑๑๗๗๗๐ ผู้
 ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ หน.ป.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

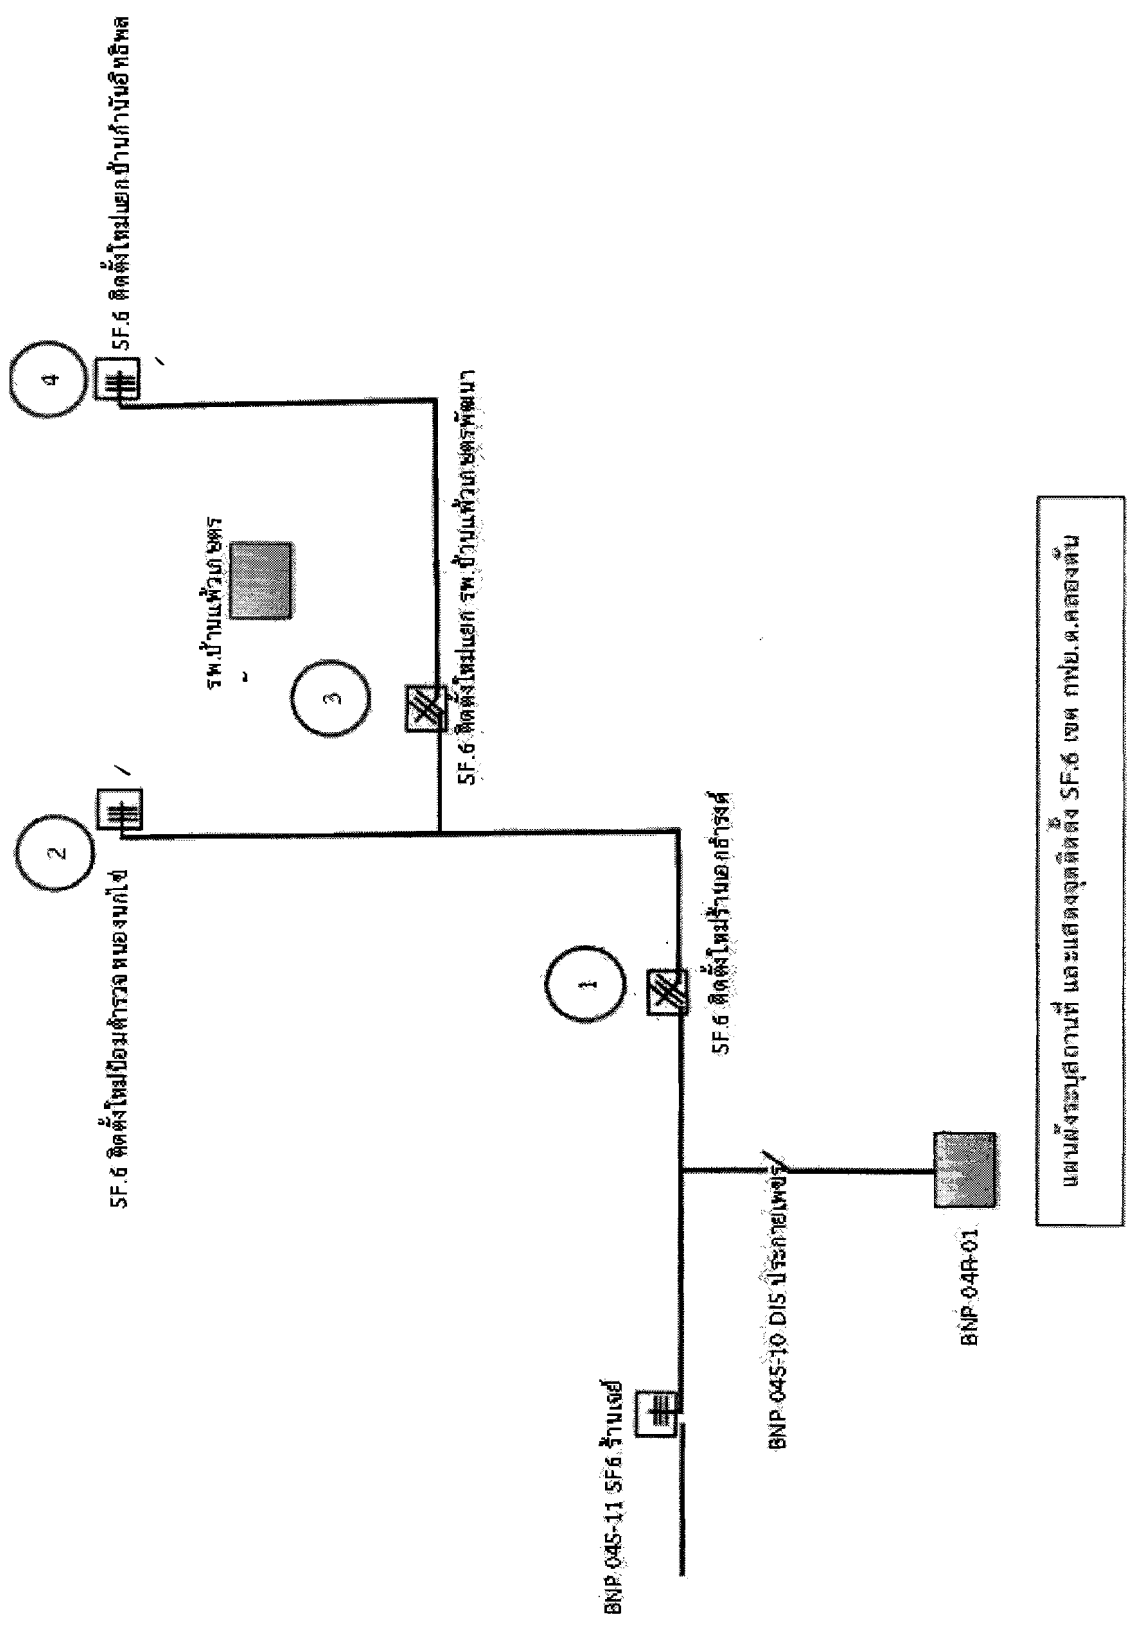

SF.6 ติดตั้งใหม่สำหรับห้องนอน

SF.6 ติดตั้งใหม่แยกบ้านเลขที่ 11

รพ. บ้านแพ้ว

3

SF.6 ติดตั้งใหม่แยก บ้านเลขที่ 11

1

SF.6 ติดตั้งใหม่ในบ้านเลขที่ 11

BNP-045-10 DIS บริเวณภายใน

BNP-04R-01

แผนผังระบบสถานที่ และแสดงจุดติดตั้ง SF.6 เขต กทม. ด.คลองตัน

