



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สก.๒(บป.) ๑๒๕๖๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

Switching Deadline

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.สก.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.สก.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอน DIS และติดตั้ง SF.๖ ทดแทน บริเวณปากทางกิมลี หมู่ ๒ ต.สวนส้ม (ฟีดเดอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	10 บพว.	วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้ง SF.6 ทดแทน DIS.ชั่วคราว ปากทางกิมลี ได้ไลน์สายส่ง 115 เครวี.	DIS.BNP 10S-03 (เป็นมันข้างจาก) *ปัจจุบันเป็น PT*	จุดตัดเขตชั่วคราว DIS. กิมลี (โดยย้ายโหนดด้านหลังรับไฟจากวงจรข้างเคียงชั่วคราว.)	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วศก.5 ฝบป. 086 - 3633100

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒ ต.สวนส้ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บป. โทร. ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายวรชัย แก้ววิจิตร)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.สก.๒ (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP10 จาก BNP10S-03 ถึง Dis ชั่วคราว กิมลี
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 6๗๗
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย นวรินทร์ สันทรทอสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กอ.อภ.กสิ ซึล จันทร์ภาวิบูลย์


(นาย นวรินทร์ สันทรทอสิน)
รจก. 6112 พ.ค.๖๒.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1433
เรียน ผจก. กฟอ.สก.๒ (บป.)
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
รจก.บป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.บป.(ก.๓)

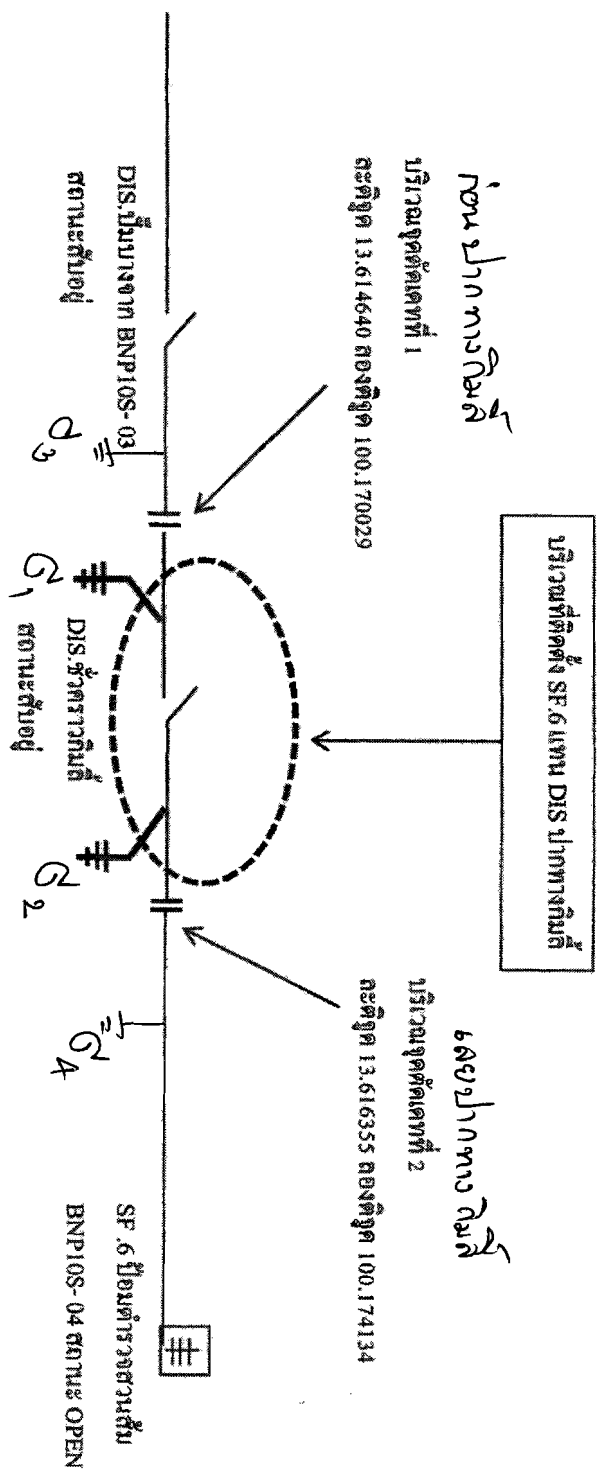
ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26 พ.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค2.(บพว.) | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวคิน | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 677 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 18 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 21 ม.ค. 62 |
| | | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching และตรวจสอบ BNP10S-04 SF6 รั่ววีสตูก่อสร้าง อยู่สถานะ ปลด+ล๊อคคาน						
2	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
3	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R R-แยกวัดราช
4	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	BNP10S-03	ล๊อค	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS บั้ม PT
6	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น.						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น.						
11	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ให้ตัด DDE ทั้ง 2 จุดตามผังแนบได้						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้ง ตัด DDE ทั้ง 2 จุดตามผังแนบแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น.						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น.						
15	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ไปถึง จุดตัด DDE ทั้ง 2 จุด						
16	BNP10S-03	ปลด	ล๊อค		บพว.		DIS บั้ม PT
17	BNP10S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		บพว.		SF6 รั่ววีสตูก่อสร้าง
18	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
19	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R R-แยกวัดราช
20	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และทำงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
21	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมดับไฟเพื่อเชื่อม DDE ทั้ง 2 จุดเข้า						
22	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
23	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R R-แยกวัดราช
24	BNP10S-03	ล๊อค	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS บั้ม PT

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	BNP10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
26	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น.							
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น.							
29	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE ทั้ง 2 จุดตามผังแนบได้							
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้ง เชื่อม DDE ทั้ง 2 จุดตามผังแนบแล้วเสร็จ							
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.							
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น.							
34	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น.							
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทั้งหมด							
36	BNP10S-03	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ปั๊ม PT
37	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	-
38	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R	R-แยกวัดราษ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าดับ หรือระบบจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน



— เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับ ไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 ≡ ตำแหน่งจุดตรวจทางกิโลมิเตอร์

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๖๒
 ผู้ควบคุมงาน นายอรรถนันต์ บัวสงค์ วิศวกร ๕ ผกส.โทร ๐๘๕๖-๓๖๓๓๓๐๐๐
 ผู้ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ หน.ป.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๖๓๓๓
