



กรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ส.นธ.ร.บ.น. ๑๓๘๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์พันธุหา

ชื่อผู้ส่ง นายวราวุธ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.อ.บ.บ. (ก.๓)

ตำแหน่ง รกค.(๓) กฟภ. นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ. นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสิ่งเขียนแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT04	20 มิถุนายน 2562	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง จาก PIC เป็น สาย SAC 185 ตรมม. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านนายโฮม - ตบ.ตลาดจินดา	NPT04S-06	Dis ชั่วคราว โรงพักตลาด จินดา (อบต.จินดา)	นายชินวัตร เกียรติ ขจรกำจาย ๐๙๒-๖๕๔๕๘๗๗
๒.	NPT09					Dis ชั่วคราว ตรงข้ามบ้าน อัครนิค	DOE ศาลารอรถ ตลาดจินดา	ตัดโดยวิธีออนไลน์ วันที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ตัดไฟ) ... สิ่งตรงข้ามหมู่บ้านนายโฮมทวานัน - โรงพัก อบต.ตลาดจินดา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ ไทอิริชต์ ... ตำแหน่ง ... รกค.ล.หมน.กฟภ.นครปฐม โทร ๐๙๙-๖๖๕๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทว. (หากมีเอกสารข่าวด.ผศ.กรล.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าวด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Handwritten signature)*

(นายวราวุธ วัลลภวิสุทธิ)

ตำแหน่ง รกค.(๓) กฟภ. นครปฐม

สำหรับแผนผังควบคุมการตัดไฟ (ผ.ล.พ. กทว.๓)

เขียน อ.อ.บ.บ. (ก.๓)

ผ.ล.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ NPT04 จาก NPT4S-06 ถึง บริเวณตรงข้ามโรงพักตลาดจินดา (อบต.จินดา) ในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสายซึ่งเลขที่ 726/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ NPT09 จาก บริเวณตรงข้ามบ้านอัครนิค ถึง DOE ศาลารอรถตลาดจินดา ในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสายซึ่งเลขที่

หมวกกันน็อกอย่างน้อย 1 คู่ กอ.๑๖๖  
14 มิ.ย. 62  
ก.๓

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอัครนิค ไทอิริชต์

*(Handwritten signature)*  
นายวราวุธ วัลลภวิสุทธิ


สำหรับข้อมูล 1633

ก.อ.บ.บ. (ก.๓)  
นายวราวุธ วัลลภวิสุทธิ

จำนวนการสำรวจ 2 ... แผน  
ฉบับร่าง 1 ... แผน


วันที่ (ลงปี)  
สถานที่ปฏิบัติงาน ... กฟภ. นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ... เป็นต้นไปจนกว่า ... จะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามหมู่บ้านมายโฮม - อบต. ตลาดจินดา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	726/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทอญ้อย			วันที่	16 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมน โชน 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>								
1	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	
2	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	
3	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		LOAD=7.30 MW	
4	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		LOAD=3.40 MW	
5	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		LOAD=8.00 MW	
6	NPT05R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		R-ไลน์บ้านตากแดด	
7	<b>**ย้ายโหลด NPT04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT05**</b>							
8	NPT04S-08	ปลด	ล๊اب		นฐ.		DIS <span style="font-size: small;">ผู้สั่งการ</span>	
9	Dis ชั่วคราว ไลน์ NPT04	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าโรงพักตลาดจินดา	
10	<b>**ย้ายโหลด NPT09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT05**</b>							
11	NPTBVB-01	ปลด	ล๊اب		NPT		- ขนานบัส	
12	NPT04S-10	ปลด	ล๊اب		นฐ.		DIS บริษัทฟ้าไทย	
13	NPT04S-09	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		โรงปุ๋ย	
14	NPTBVB-01	ล๊اب	ปลด		NPT		- ขนานบัส	
<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.</b>								
15	NPT05R-01	ล๊اب	ปลด		นฐ.		R R-ไลน์บ้านตากแดด	
16	ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดของ NPT05R-01 ออกทั้งสามเฟส							
17	Dis ชั่วคราว ไลน์ NPT09	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ตรงข้ามร้านอัดฉีดยา	
18	NPT04S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		หน้าร้านวงษ์พาณิชย์	
19	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการไลน์โหลด วงจร NPT09 ออก							
20	หลังจาก กฟจ.นฐ. ทำการไลน์โหลด วงจร NPT09 ออก แล้วเสร็จ							
21	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการปลด DDE ไลน์วงจร NPT09 บริเวณศาลารอรถตลาดจินดา ออกทั้งสามเฟส							
22	หลังจากขอทไลน์กระเช้าทำการปลด DDE ไลน์วงจร NPT09 บริเวณศาลารอรถตลาดจินดา ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นฐ. ทราบ						นฐ.	
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						นฐ.	
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						นฐ.	
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						นฐ.	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
28	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
29	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
30	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
31	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
32	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
33	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
34	หลังจาก กพจ.นฐ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
35	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
36	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
37	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
38	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
39	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1				นฐ.		
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2				นฐ.		
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3				นฐ.		
43	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4				นฐ.		
44	แจ้งฮอทไลน์กระเช้าทำการจี้ม DDE ไลน์วงจร NPT09 บริเวณศาลารอรถตลาดจินดา เข้าทั้งสามเฟส						
45	หลังจากฮอทไลน์กระเช้าทำการจี้ม DDE ไลน์วงจร NPT09 บริเวณศาลารอรถตลาดจินดา เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
46	Dis ชั่วคราว ไลน์ NPT09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามร้านอัดฉีด
47	สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดของ NPT05R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
48	NPT05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.		R R-ไลน์บ้านตากแดด
49	NPT04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
50	**ย้ายโหลด NPT09 บางส่วนกลับคืนจาก NPT05**						
51	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนนานบัส
52	NPT04S-09	ปลด	สับ		นฐ.		โรงปุ๋ย
53	NPT04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS บริษัทฟ้าไทย
54	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนนานบัส
55	**ย้ายโหลด NPT04 บางส่วนกลับคืนจาก NPT05**						
56	Dis ชั่วคราว ไลน์ NPT04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าโรงพักตลาดจินดา
57	NPT04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS <del>หน้าโรงพัก</del>
58	แจ้ง กพจ.นฐ. ทำการนำโหลด วงจร NPT09 กลับคืน						
59	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
60	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
61	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
62	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
63	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
64	NPT05R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R-ไลน์บ้านตากแดด
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น							

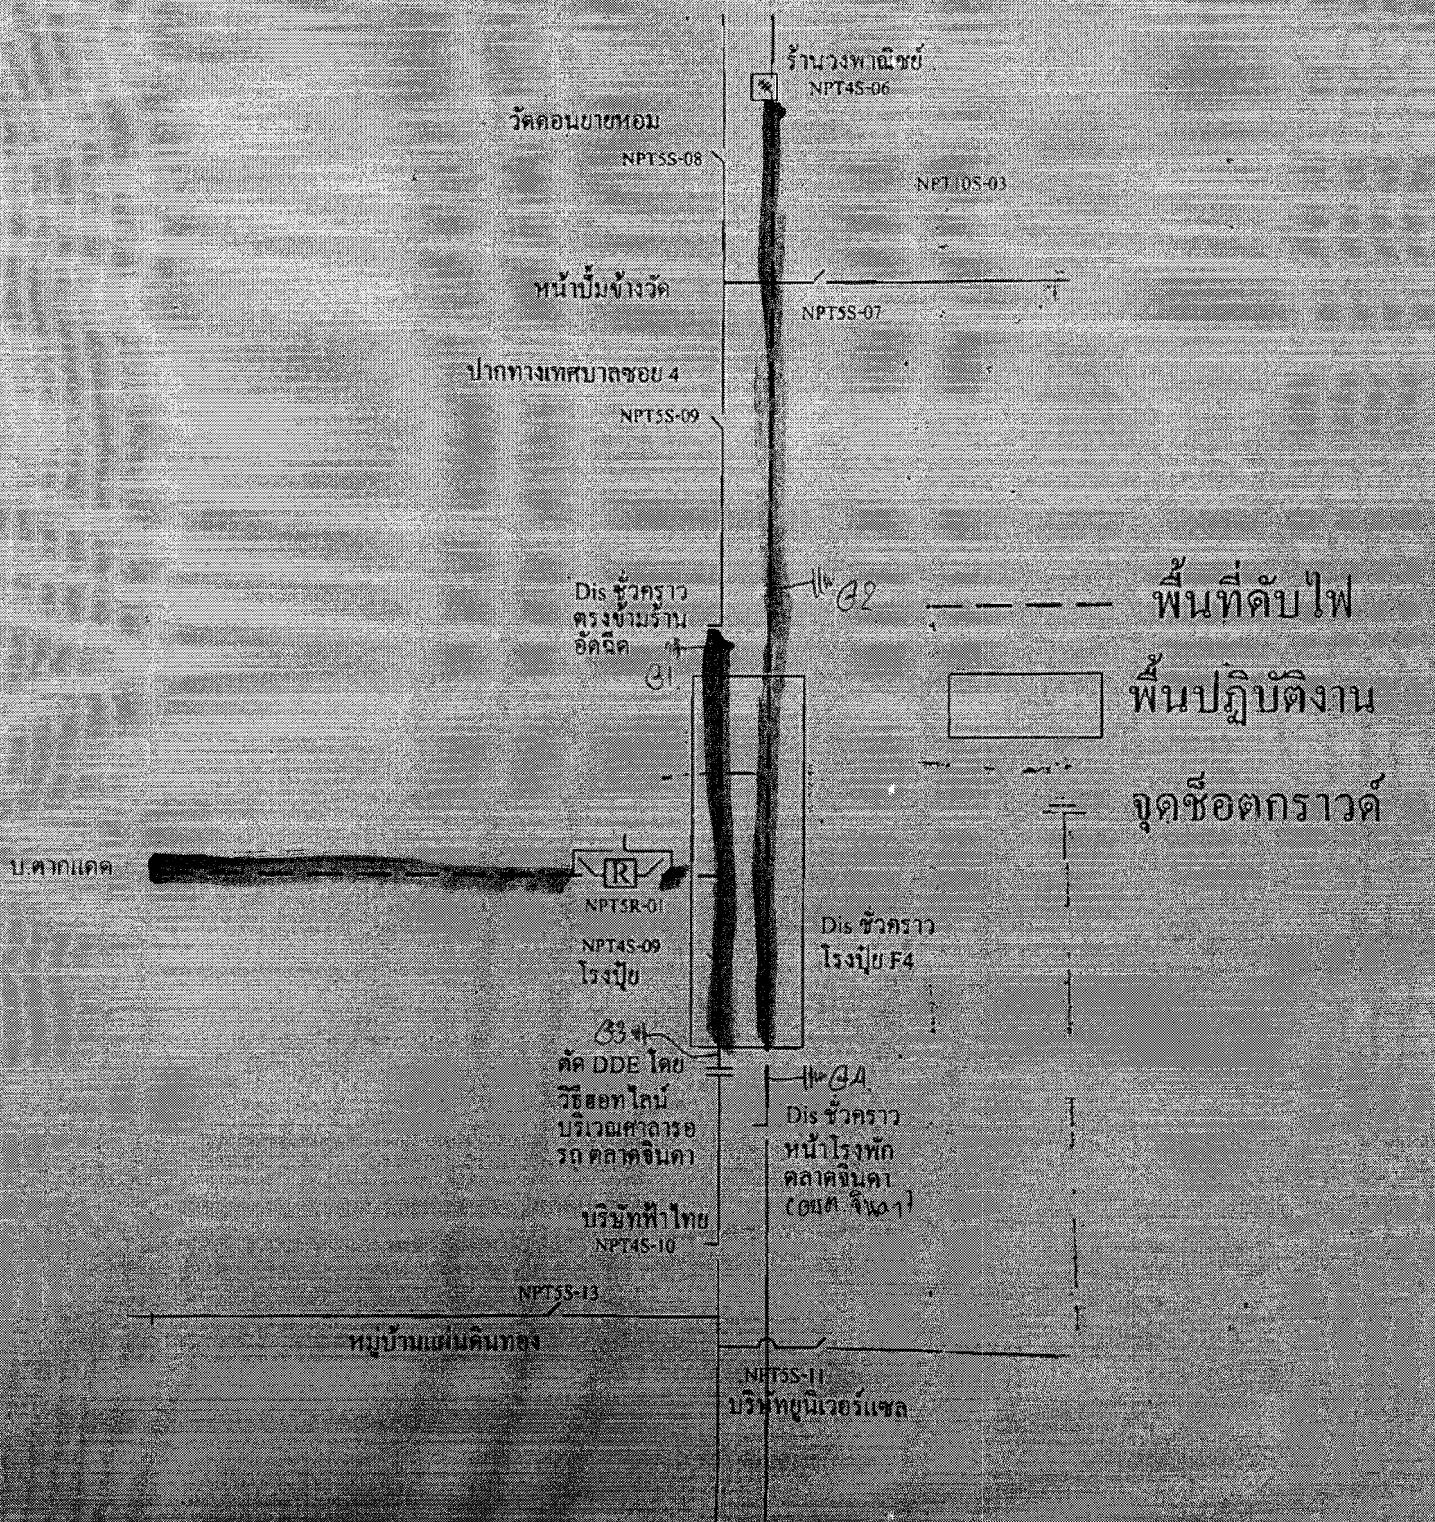

ร้านวงพาณิชย์  
NPT4S-06

วัดคอนยาหอม  
NPT5S-08

NPT10S-03

หน้าบ่ิมจ้างวัด

NPT5S-07

ปากทางเทศบาลซอย 4

NPT5S-09

Dis ชั่วคราว  
ตรงข้ามร้าน  
อัครฉัตร

31

พื้นที่คับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดเชื่อมต่อกราวด์

บ. ตากแดด

R

NPTSR-01  
NPT4S-09  
โรงปุ๋ย

Dis ชั่วคราว  
โรงปุ๋ย F4

33

ตัด DDE โดย  
วิธีสกัดไอน้ำ  
บริเวณศาลารอย  
รถ คลคพอินคา

บริษัททำไทย  
NPT4S-10

34

Dis ชั่วคราว  
หน้าโรงพัก  
ตลาดอินคา  
(เขต จ.พิจิตร)

NPT5S-13

หมู่บ้านแต่มคณทอง

NPT5S-11

บริษัทยูนิเวอร์แซล
