



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สก.๒(บ.บ.) ๑๘๕๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงาม

Switching Deadline

วันที่ 12 มิ.ย. 62

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสวิชใบมีด และติดตั้ง SF.6 บริเวณคลองชลประทาน ตี ๗ (พัดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	02 บพว.	วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.2562	08.30 น.	16.30 น.	รื้อถอน DIS.และติดตั้ง SF.6 บริเวณคลองชลประทาน (ตี 7)	DIS. BNP025 - 11	สุทธระบบจำหน่ายฯ	นายอรุณรัตน์ บำรุงศักดิ์ วคก.5 ผ.บ. 086 - 3633100

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๕ ต.ชัยมงคล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไหลงาม)

ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.สก.2 (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BNP2 จาก BNP25-11 ถึง ปลายรูป
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 764/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ พ.ย.ศักดิ์ชัย อภิพัทธภาอภิบุณย์

นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
26 มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1595

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สก.2 (บ.บ.)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

10 มิ.ย. 2562

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

งานที่ทำงาน	ไลน์ BNP02 บริเวณ DDE.ก่อนเข้า DIS.BNP02S-11 -ปลายสาย		
หนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
อทำงาน	กฟจ.สค.2(บพว.)	งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 764/62
รียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 9 มิถุนายน 2562
วสอบสวิตชิงโดย	<i>นายศักดิ์สิทธิ์</i>		วันที่ 9 มิ.ย. 62
เมิตีสวิตชิงโดย	<i>[Signature]</i>		วันที่ 6 มิ.ย. 62
ทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
BNP02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BNP		
BNP07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BNP		
- ตัดไฟไลน์ BNP02 เวลา 08.30 น.						
BNP02S-11	สับ	ปลด,ใช้โหดบาสเตอร์		รถบพว-		DIS คลองชลประทาน(ตี่7)
แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมช่วงตึงเข้า BNP02S-11 บริเวณปากทางเข้าคลองชลประทาน(ตี่7)ได้						
หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมช่วงตึงเข้า BNP02S-11 บริเวณปากทางเข้าคลองชลประทาน(ตี่7)เสร็จเรียบร้อย						
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)รับทราบ						
แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ทำการ Short Ground จุด G1						
แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ทำการ Short Ground จุด G2						
แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
BNP02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BNP		
BNP07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BNP		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
หลังจากกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่แทน DIS.รหัส BNP02S-11 ให้เปิดวงจรออกไว้โชว์ "OFF"						
แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
แจ้งกฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
BNP02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BNP		
BNP07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BNP		
แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมสายช่วงตึงเข้า BNP02S-11 บริเวณปากทางเข้าคลองชลประทาน(ตี่7)ได้						

รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจุ่มสายช่วงตึงเข้า BNP02S-11 บริเวณปากทางเข้าคลองชลประทาน(ตี7)เสร็จเรียบร้อย						
BNP02S-11	ปลด	สับ		รทพว-		SF6 คลองชลประทาน(ตี7)
BNP02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BNP		
BNP07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BNP		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ใต้ดิน พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

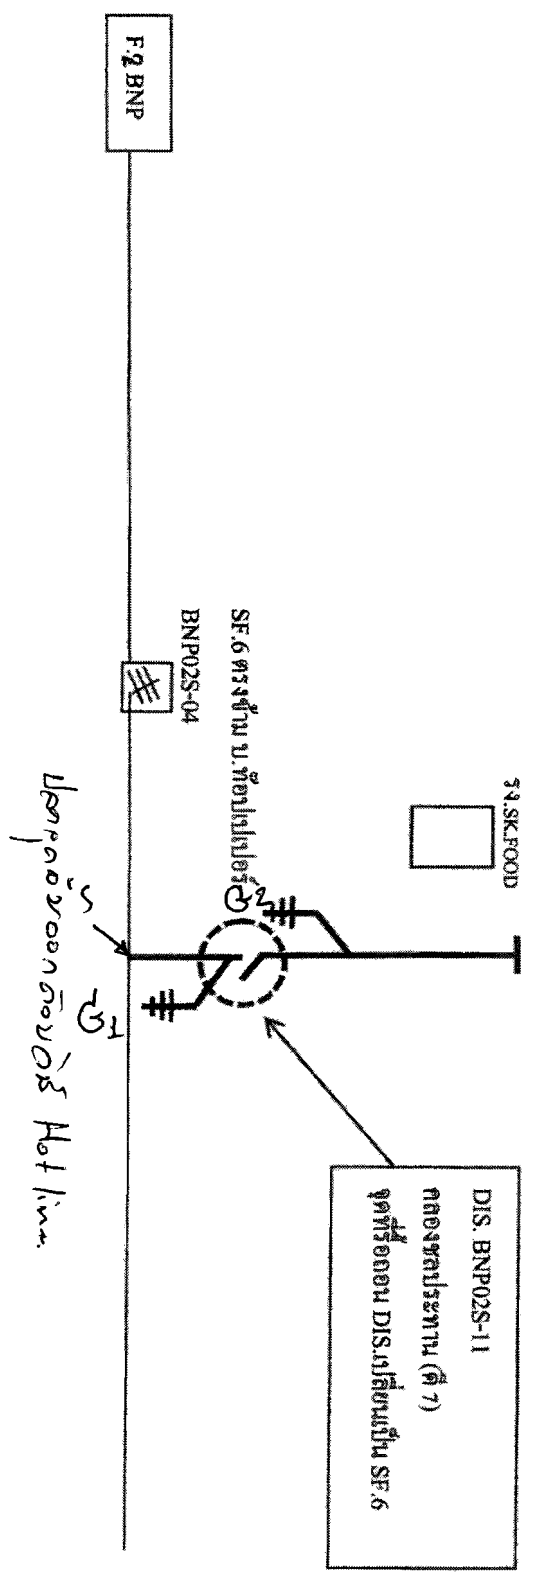

———— เส้นตีกับแสดงพื้นที่ใต้ดิน ไปปฏิบัติงาน
 ⚡ ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์
