



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ (ค.๓.๒(ปบ.) ๑๕๑๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไทลงาม

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟ.จ.ส.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟ.จ.ส.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อให้ กฟ.ค.คอนไม่ ติดตั้ง SF.๖ บริเวณซอยถนนเอกชัยสายเก่า (พืดเตอร์ ๙ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	09 สค.5	วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562	09.00 น.	16.30 น.	กฟ.ค.คอนไม่ ขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง SF.6	SME 09S - 01	จุดตัดเคห์ใต้ไลน์สายส่ง	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วกค.5 ผ.บ. 086-3633100 (ควบคุมงานดับไฟ)
2.	09 คค.5	วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562	09.00 น.	16.30 น.	ตัดต่อ SF6 (ด้วยวิธี hotting)	SME 9S-02	SME 9S-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒ ต.นางโพธิ์ (ผู้ใช้ไฟจำนวน ๒ ราย)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บ. โทร. ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไทลงาม)
ตำแหน่ง ผจก. กฟ.จ.ส.๒ (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟ.ก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พืดเตอร์ SME 09 จาก SME 9S-01 ถึง กคคต DDE ๗๖๖๖๖
ในวันที่ 25 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 801
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พืดเตอร์ SME 09 จาก SME 9S-02 ถึง SME 9S-02
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 801

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพงษ์ ไทลงาม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ภักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์
20 มิ.ย. 62

สมพงษ์ ตันศิริเกียรติ
(๐๐๖.6 แทน นพ.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 1750
เรียน ผจก. กฟ.จ.ส.๒(บ.พ.)

อ.ก.บ.ช.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

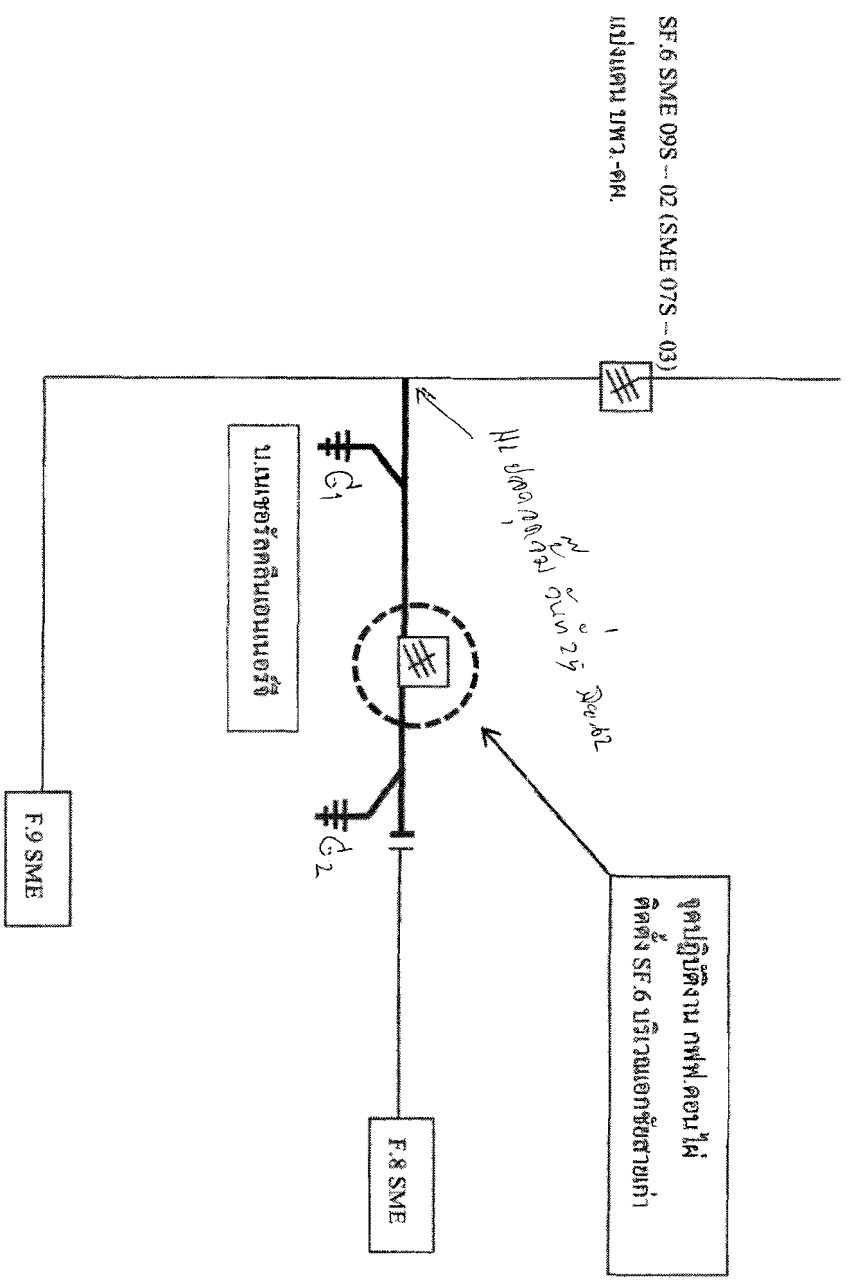
(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พนา)
21 มิ.ย. 2562
จ.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | SME09S-01,SME09S-02 ถึง จุดตัด DDE ได้ไลน์สายส่ง,SME09S-02 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24,25/6/2019 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สก.2(บพว.) | งานที่ทำ | ติดตั้ง SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 801/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 21 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 21 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ ๒1 มิ.ย 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	วันที่ 24/6/62 HL ติดตั้ง SF6 บริเวณปากทางธรรมโชติ รหัส SME09S-02						
3	SME09VB-01	Auto	Manual				
4	แจ้ง HL ติดตั้ง SF6						
5	เมื่อ HL ติดตั้ง SF6 แล้วเสร็จ						
6	ตรวจสอบสถานะ SF6 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
7	SME09VB-01	Manual	Auto				
8	สิ้นสุด Switching ของวันที่ 24/6/62						
9	วันที่ 25/6/62 กฟจ.สก2(บพว.)ทำการติดตั้ง SF6 บริเวณเอกชัยสายเก่า						
10	SME09VB-01	Auto	Manual				
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.แจ้ง กฟจ.สก2(บพว.) โหลดโหลดหม้อแปลง 2 เครื่อง						
12	แจ้ง HL ปลดจุดจัมแปกธรรมโชติออกตามผังแนบ						
13	เมื่อ HL ปลดจุดจัมแปกธรรมโชติออกตามผังแนบแล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	SME09VB-01	Manual	Auto				
17	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
18	เมื่อชุด กฟจ.สก2(บพว.)ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	SME09VB-01	Auto	Manual				
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
22	ตรวจสอบสถานะ SF6 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
23	แจ้ง HL เชื่อมจุดจัมแปกธรรมโชติเข้าตามผังแนบ						
24	เมื่อ HL เชื่อมจุดจัมแปกธรรมโชติเข้าตามผังแนบแล้วเสร็จ						
25	SME09S-05	ปลด	ลับ		บพว.	SF6	เอกชัยสายเก่า
26	SME09VB-01	Manual	Auto				
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน



— เส้นที่แสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน
⚡ ตำแหน่งจุดชัศตกราวด์
