



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ อก.ทอ. ๖๑๑ /๒๕๖๒

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์ตันธุ์

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนฤมิตร ศิริภทร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทอ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ /บริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก                 | ถึง                     | ผู้ควบคุมงาน                           |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---------------------|-------------------------|--|
| ๑.  | F๕       | ๓ ก.ค. ๖๒    | ๐๕.๐๐ น.    | ๑๖.๐๐ น. | ติดตั้งไม้คร่อมแนวสายไฟ                  | VLA๕๓-๐๒<br>บ้านจอย | VLA๕๕-๐๒<br>บ้านตุลาการ | นายธีรพงษ์ มาทวีศร<br>โทร. ๐๘๕-๖๐๖๖๒๕๕ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้รับผลกระทบ น.ถิเรศ ต.บึงเหล็ก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

จำนวน ๕๐.๖๖๖

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย ธีรประเสริฐ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทอ. โทร. ๐๘๕-๕๕๗-๖๐๖๕๕

ลงชื่อ

( นายนฤมิตร ศิริภทร )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เขียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ VLA5 จาก VLA5R-01 ถึง VLA5R-02

ในวันที่ 3 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 941/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟให้ นายสมชาย ธีรประเสริฐ

( นายนฤมิตร ศิริภทร )  
อก.บป.(ก.๓)

ส่วนรับผู้มีมติ

ที่ ก.๓ กฟท.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟส.ทอ.; กฟท.๓

อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

มทพ.๐๘(rev.๐๖/๒๕๖๐)



ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

มทพ. - (สถาปนา - )

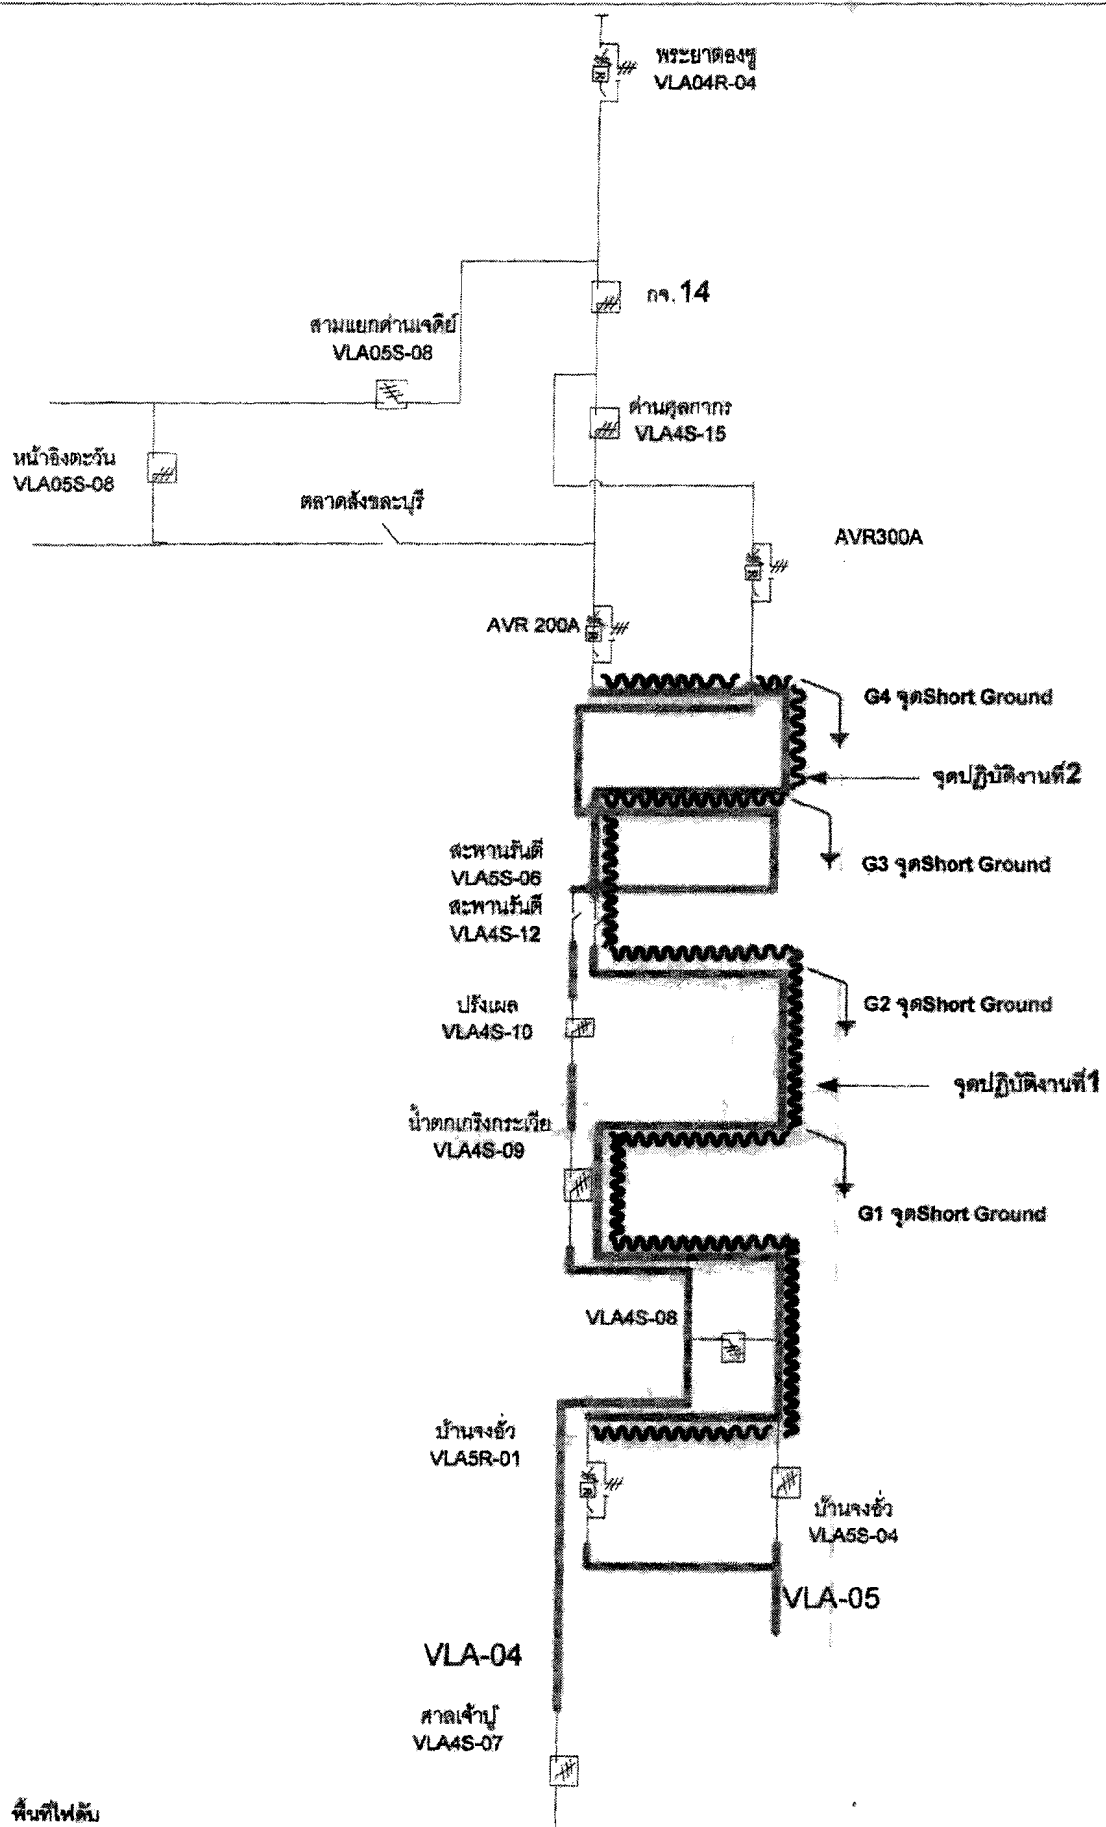
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน VLA5R-01(บ้านจ้งอ้ว)-VLA5R-02(ด้านสุลกากร)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทก. งานที่ทำ ตัดต้นไม้พร้อมแนวสายไฟ ตามใบขอปฏิบัติงาน 941/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนซ์ ทองย้อย วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 2 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 2 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่  | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                             |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|--------------------------------------|
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดคอนภายในสถานี |   |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 1  | VLA05R-01   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | ทก.          |            | AVR บ้านจ้งอ้ว                       |
| 2  | VLA05R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | ทก.          |            | R บ้านจ้งอ้ว                         |
| 3  | VLA04R-03   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | ทก.          |            | AVR ด้านสุลกากร                      |
| 4  | VLA04R-03   | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | ทก.          |            | R ด้านสุลกากร                        |
| 5  | VLA05R-02   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | ทก.          |            | AVR ด้านสุลกากร                      |
| 6  | VLA05R-02   | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | ทก.          |            | R ด้านสุลกากร                        |
| 7  | แจ้ง กฟส.ทก. ตรวจสอบ SF6 VLA4S-08(ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย), VLA4S-11(สะพานวันดี) อยู่สถานะปลดพร้อมล๊อคคาน |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 8  | ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA04  |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 9  | VLA04S-16   | ปลด                                  | ล๊อค              |      | ทก.          |            | SF6 บั้มตำวาง 3 แยกค่านเจดีย์ 3 องค์ |
| 10   | VLA05R-02   | ล๊อค                                 | ปลด               |      | ทก.          |            | AVR ด้านสุลกากร                      |
| 11   | แจ้ง กฟส.ทก. ปลดสวิตซ์ใบมีดคานโหลดของ VLA5R-02 ออกทั้งสามเฟส  |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.              |   |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 12   | VLA05R-01   | ล๊อค                                 | ปลด               |      | ทก.          |            | AVR บ้านจ้งอ้ว                       |
| 13   | แจ้ง กฟส.ทก. ปลดสวิตซ์ใบมีดคานโหลดของ VLA5R-01 ออกทั้งสามเฟส  |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 14   | แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กฟส.ทก. ทราบ   |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 15   | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1  |                                      |                   |      |              | ทก.        |                                      |
| 16   | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2  |                                      |                   |      |              | ทก.        |                                      |
| 17   | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3  |                                      |                   |      |              | ทก.        |                                      |
| 18   | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4  |                                      |                   |      |              | ทก.        |                                      |
| 19   | แจ้ง กฟส.ทก. ปฏิบัติงานได้  |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 20   | VLA04R-03   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | ทก.          |            | AVR ด้านสุลกากร                      |
| 21   | VLA04R-03   | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | ทก.          |            | R ด้านสุลกากร                        |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า                     |   |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 22   | กฟส.ทก. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ   |                                      |                   |      |              |            |                                      |
| 23   | VLA04R-03   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | ทก.          |            | AVR ด้านสุลกากร                      |
| 24   | VLA04R-03   | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | ทก.          |            | R ด้านสุลกากร                        |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ        |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 25  | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด  | Short Ground จุด G1                  |                         |      | ทภ.          |            |                 |
| 26  | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด  | Short Ground จุด G2                  |                         |      | ทภ.          |            |                 |
| 27  | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด  | Short Ground จุด G3                  |                         |      | ทภ.          |            |                 |
| 28  | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด  | Short Ground จุด G4                  |                         |      | ทภ.          |            |                 |
| 29  | ตั้ง Manual Tap AVR รหัส VLA5R-01(บ้านจางอ้ว) อยู่ Tap 1           |                                      |                         |      |              |            |                 |
| 30  | แจ้ง กฟส.ทภ.สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดของ VLA5R-01 เข้าทั้งสามเฟส      |                                      |                         |      |              |            |                 |
| 31  | VLA05R-01  | ปลด                                  | สับ คง Nonreclosing,Alt |      | ทภ.          |            | AVR บ้านจางอ้ว  |
| 32  | ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนกลับคืนจาก VLA04 **                          |                                      |                         |      |              |            |                 |
| 33  | ตั้ง Manual Tap AVR รหัส VLA5R-02(ด้านสุลภากร) อยู่ Tap 1          |                                      |                         |      |              |            |                 |
| 34  | แจ้ง กฟส.ทภ.สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดของ VLA5R-02 เข้าทั้งสามเฟส      |                                      |                         |      |              |            |                 |
| 35  | VLA05R-02  | ปลด                                  | สับ คง Nonreclosing,Alt |      | ทภ.          |            | AVR ด้านสุลภากร |
| 36  | VLA05S-12  | สับ                                  | ปลด                     |      | สขบ.         | SCADA      | SF6 ครีวคุณแม่  |
| 37  | VLA05R-01  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | ทภ.          |            | AVR บ้านจางอ้ว  |
| 38  | VLA05R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal                  |      | ทภ.          |            | R บ้านจางอ้ว    |
| 39  | VLA04R-03  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | ทภ.          |            | AVR ด้านสุลภากร |
| 40  | VLA04R-03  | Nonreclosing, ALT                    | Normal                  |      | ทภ.          |            | R ด้านสุลภากร   |
| 41  | VLA05R-02  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | ทภ.          |            | AVR ด้านสุลภากร |
| 42  | VLA05R-02  | Nonreclosing, ALT                    | Normal                  |      | ทภ.          |            | R ด้านสุลภากร   |
| 43  | ตั้ง Auto Tap AVR รหัส VLA5R-01(บ้านจางอ้ว),VLA05R-02(ด้านสุลภากร) |                                      |                         |      |              |            |                 |
|     | สิ้นสุด Switching  |                                      |                         |      |              |            |                 |



~~~~~ สิ้นที่ไฟดับ

↓ จุด Short ground

ฉบับ 3 กค. 2562

ติดตั้งใช้ ณ อาคารพาณิชย์
