



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คทท.(ปบ.)๑๐๕๙/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

Switching Deadline

วันที่ 10 ก.ค. ๖๒

วิญญูขอดับไฟ

1812

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ๑๑๕kv สมุทรสาคร ๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 kv	๑๕ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงอาร์ค ตันDDE	SMC06YS-08	สถานีฯ สมุทรสาคร 6	นายวรวิทย์ เนื่องนอง ไทร ๐๙๕-๕๙๕๗๓๓๔
๒	SMF6	๑๕ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สมุทรสาคร 6	EKU2S-04 SMF6S-03	
๓	SMF7	๑๕ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สมุทรสาคร 6	EKU1S-08 SMF7S-03 SMF2S-05 DISชั่วคราวก่อน ถึงโมเดิร์นวิลด์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แวดวนนสาวรินฝั่งริมคลองบางส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115 KV จาก SMF 4VB-01 ถึง GNC 64S-08
ในวันที่ 14 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 999

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMF 6 จาก SMF 6VB-01 ถึง 9MF 6S-03, EKV 29-04
ในวันที่ 14 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SMF 7 จาก SMF 7VB-01 ถึง Dis มุมพัน โคม ตีร์น
ในวันที่ 14 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชา มงค ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สก.คคฟ. กวณ พันธ
สหพร ตันติเกียรติ
(๐๙ ก. ๖ ๑๓๖ นน.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ 1312

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓ กฟภ. ๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

๒.1 ก.ก. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น


แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี 9MF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ช็อตกราวด์จุด G1 แล้วแจ้งเวลากลับ						
30	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ช็อตกราวด์จุด G2 แล้วแจ้งเวลากลับ						
31	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ช็อตกราวด์จุด G3 แล้วแจ้งเวลากลับ						
32	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ช็อตกราวด์จุด G4 แล้วแจ้งเวลากลับ						
33	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
34	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
35	SMF05VB-01	Manual	Auto		SMF		-
36	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF		-
37	SXA02YB-01	Manual	Auto		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้ง กฟส.โคกขาม ปฏิบัติงานได้ (เทมาข แนช 215 KV ไม่มี ช็อตกราวด์ ปลด เพื่อ กั้น ไฟ อันดีด้วย 22 kv.)						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
39	เมื่อ กฟส.โคกขาม ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
40	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
41	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
42	SMF05VB-01	Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
43	SMF09VB-01	Auto	Manual		SMF		-
44	SXA02YB-01	Auto	Manual		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
45	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1 แล้วออกแจ้งเวลากลับ						
46	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์จุด G2 แล้วออกแจ้งเวลากลับ						
47	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์จุด G3 แล้วออกแจ้งเวลากลับ						
48	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์จุด G4 แล้วออกแจ้งเวลากลับ						
49	SMF06S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.6
50	SMF07S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.7
51	SMF06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		-
52	SMF07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		-
53	SMC06YS-08	ปลด	สับ		คกข.		ABS.115KV. บ. SCC RESIDENT
54	SMF04YS-01	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 เควี
55	SMF04YS-03	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 เควี
56	SMF04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SMF04YB-01	Manual	Auto		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SXA02YB-01	Manual	Auto		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	ย้ายโหลด SMF07 กลับจาก SMF09						
60	Dis ม.โมเดิร์นวิลส์	ปลด	สับ		คกข.		DIS
61	SMF02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม (ข้ามถนนบน)
62	ย้ายโหลด SMF06 กลับจาก SMF05						
63	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		-
64	SMF06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 ม.แสนสุข
65	SMF05S-05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS วัดโคกขาม
66	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
68	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
69	SMF05VB-01	Manual	Auto		SMF		-	-
70	SMF06VB-01	Manual	Auto		SMF		-	-
71	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF		-	-
72	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

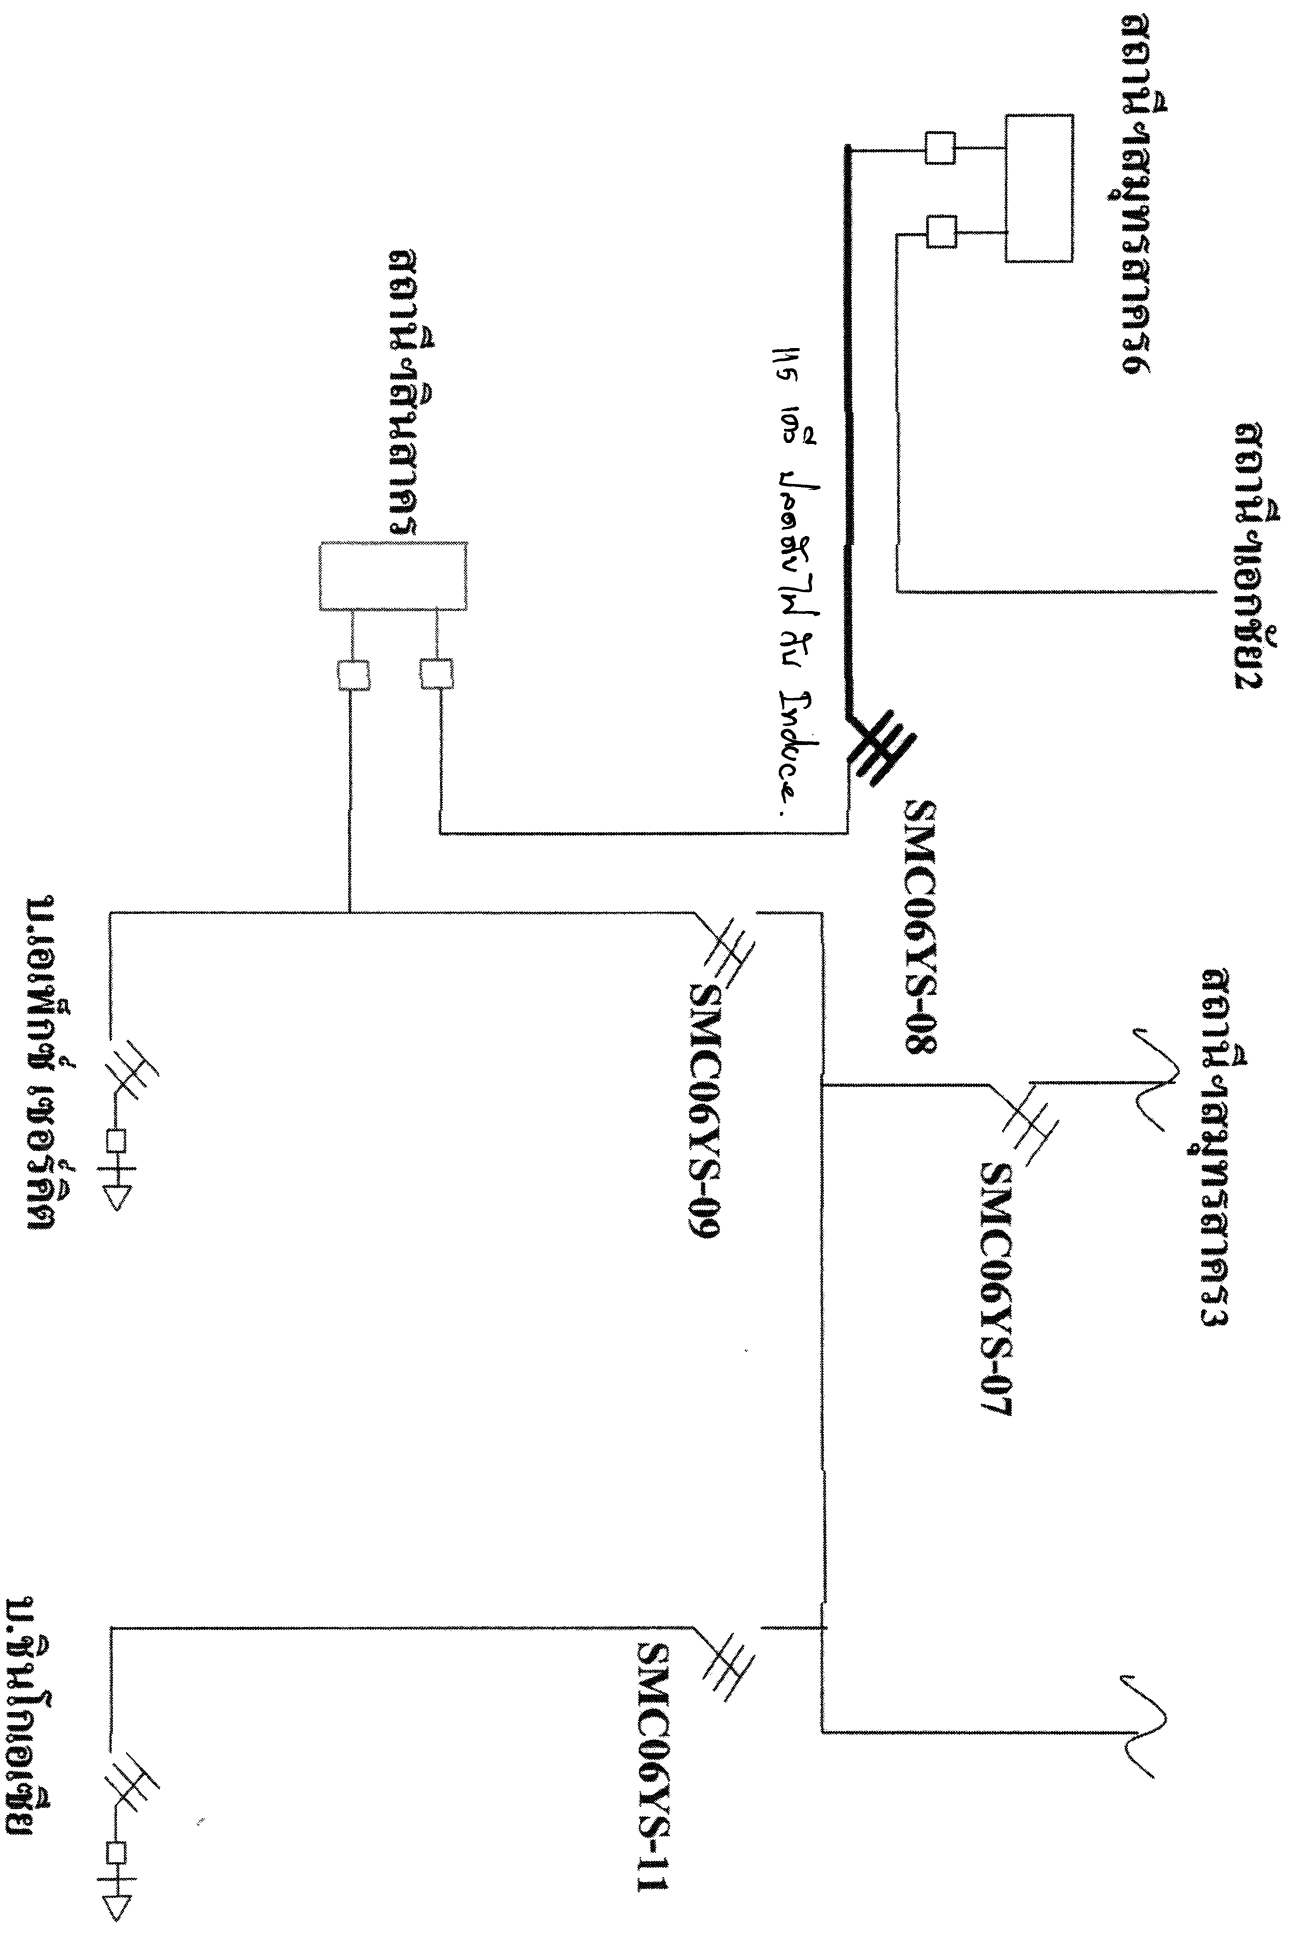

เจริญสินช

DISชั่วคราวติดตั้งใหม่
ก่อนถึงโมเดิร์นวิลล์

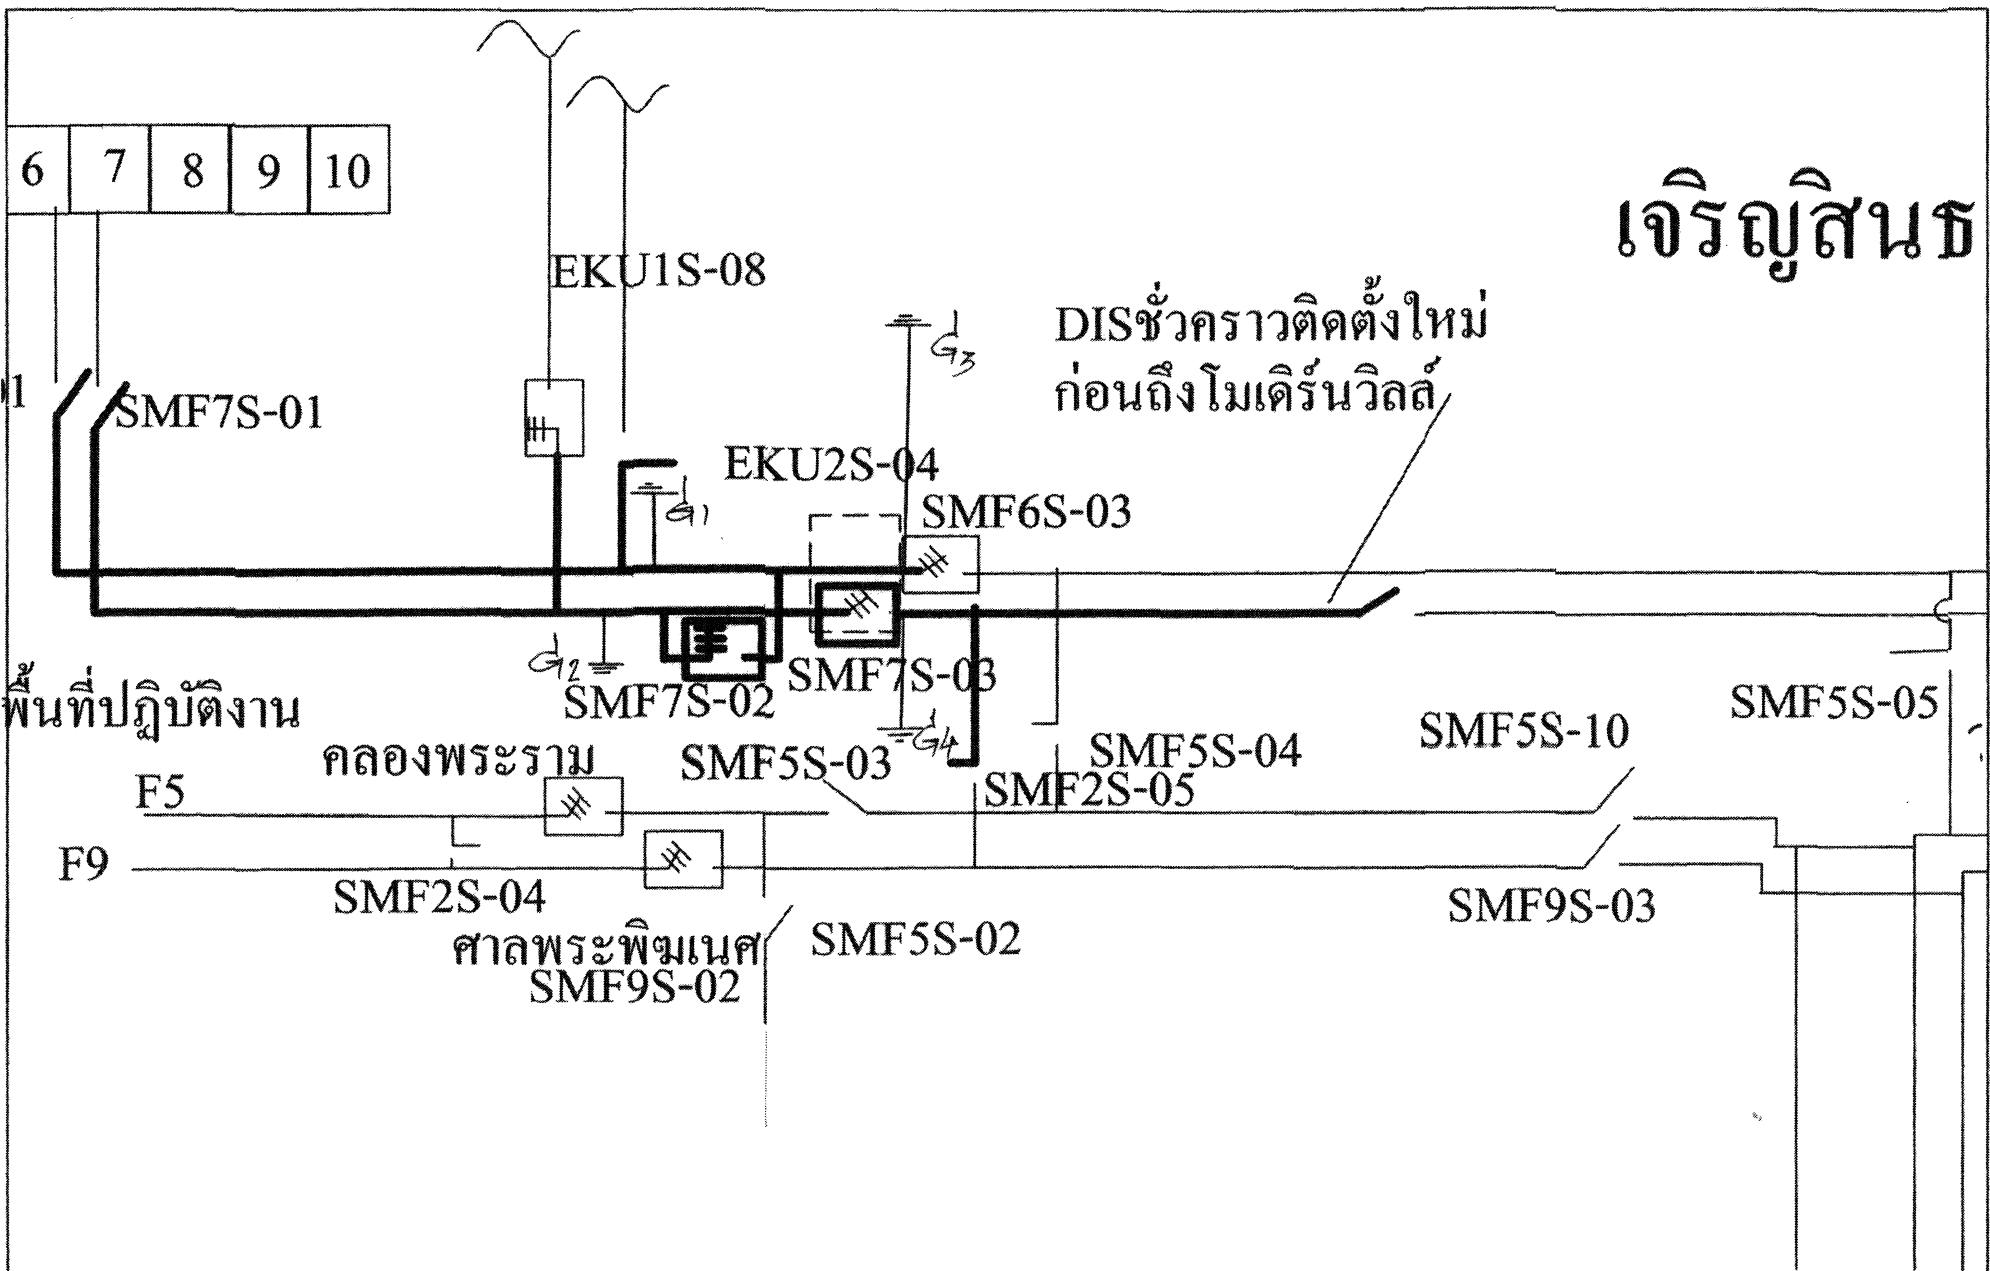

แผนควบคุมการจ่ายไฟ ของควบคุมการจ่ายไฟ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วันที่
ผู้จัดทำ: วิศวกรไฟฟ้า	ผู้ว่าการ	ตรวจสอบโดย
ตรวจสอบ: วิศวกรไฟฟ้า	สถานี: ดินสาด	วันที่: 18/02/2557
ผู้ควบคุมการเดิน	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ กคร.(ก.3)	ตรวจสอบโดย
วันที่: 18/02/2557		วันที่: 18/02/2557
