



วิทยุขอดับไฟ

1935

Switching Deadline

วันที่ 16 ก.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)-๑๑๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๙ ก.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง ๒๒ KV สะพานยางสูง ถึง ตลาดหนองรี ต.หุ้มรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	DIS ตรงข้าม ร.ร.ยางสูง BOP๐๕S-๐๗	DIS ชด. ติดตั้งใหม่ ตลาดหนองรี	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐
๒	๕	๑๙ ก.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SF๖ หน้าร้าน ยางสูง BOP๐๕S-๐๘	AVR บ้านหนองรี BOP๐๕R-๐๓	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เมลิ่งสงคราม ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร ๐๘๕-๒๕๓๑๙๖๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)



๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)
(..... ผจก.กฟอ.บพล.)
ตำแหน่ง ๓ ก.ค. ๒๕๖๒

๓ ก.ค. ๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แนวถนนบ่อพลอย - หนองปรือ (บ้านยางสูง - บ้านหนองรี)								
กำหนดวันที่ทำงาน	19/07/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	19/07/2562	เวลา	17.00 น.		
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย BOP04,BOP05		ตามใบขอปฏิบัติงาน	975/2562			
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	7 กรกฎาคม 2562			
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 ก.ค. 62			
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 ก.ค. 62			
สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
					2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ BOP,LWU,DAA							
1	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA09						
2	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R ยางสูง พร้อม Manual TAP AVR
3	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ทុងแสม พร้อม Manual TAP AVR
4	BOP04S-16	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปลั๊กประตู
5	BOP04S-09	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านไร่พัฒนา
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R ยางสูง พร้อม AUTO TAP AVR
7	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ทុងแสม พร้อม AUTO TAP AVR
8	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนไปรับไฟจาก LWU02						
9	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		บพล.		R หนองรี พร้อม Manual TAP AVR
10	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R เลื่อมพระเกรียรติ พร้อม Manual TAP AVR
11	DAA09S-19	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปลั๊กประตู
12	BOP05R-03	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		R หนองรี
13	Sw.load. BOP05R-03	ล๊ับ	ปลด		หปร.		R หนองรี
14	LWU02R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R เลื่อมพระเกรียรติ พร้อม Auto TAP AVR
15	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
16	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
17	BOP05S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยางสูง
18	BOP04S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร. บ้านยางสูง
19	DIS.ชั่วคราว	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ก่อนตลาดบ้านหนองรี
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
24	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R ยางสูง
26	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ทુંแสม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
28	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R ยางสูง พร้อม Manual TAP AVR
29	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ทુંแสม พร้อม Manual TAP AVR
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				บพล.		
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				บพล.		
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				บพล.		
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				บพล.		
34	BOP05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.		SF6 รัานขายาบ้านยางสูง
35	BOP04S-07	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร. บ้านยางสูง
36	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS ก่อนตลาดบ้านหนองรี
37	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
38	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนคืนจาก LWU02						
39	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R เลฉิมพระเกรียรติ พร้อม Manual TAP A
40	Sw.load. BOP05R-03	ปลด	สับ		หปร.		R หนองรี พร้อมปรับ TAP AVR เป็น TAP 1
41	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.		R หนองรี
42	DAA09S-19	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 ปลักประตู
43	LWU02R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R เลฉิมพระเกรียรติ พร้อม Auto TAP AVR
44	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรี พร้อม Auto TAP AVR
45	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนคืนจาก DAA09						
46	BOP04S-09	ปลด	สับ		ศุนย์ฯ		SF6 บ้านไร่พัฒนา
47	DAA09S-19	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 ปลักประตู
48	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R ยางสูง พร้อม AUTO TAP AVR
49	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ทુંแสม พร้อม AUTO TAP AVR
สิ้นสุด Switching							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

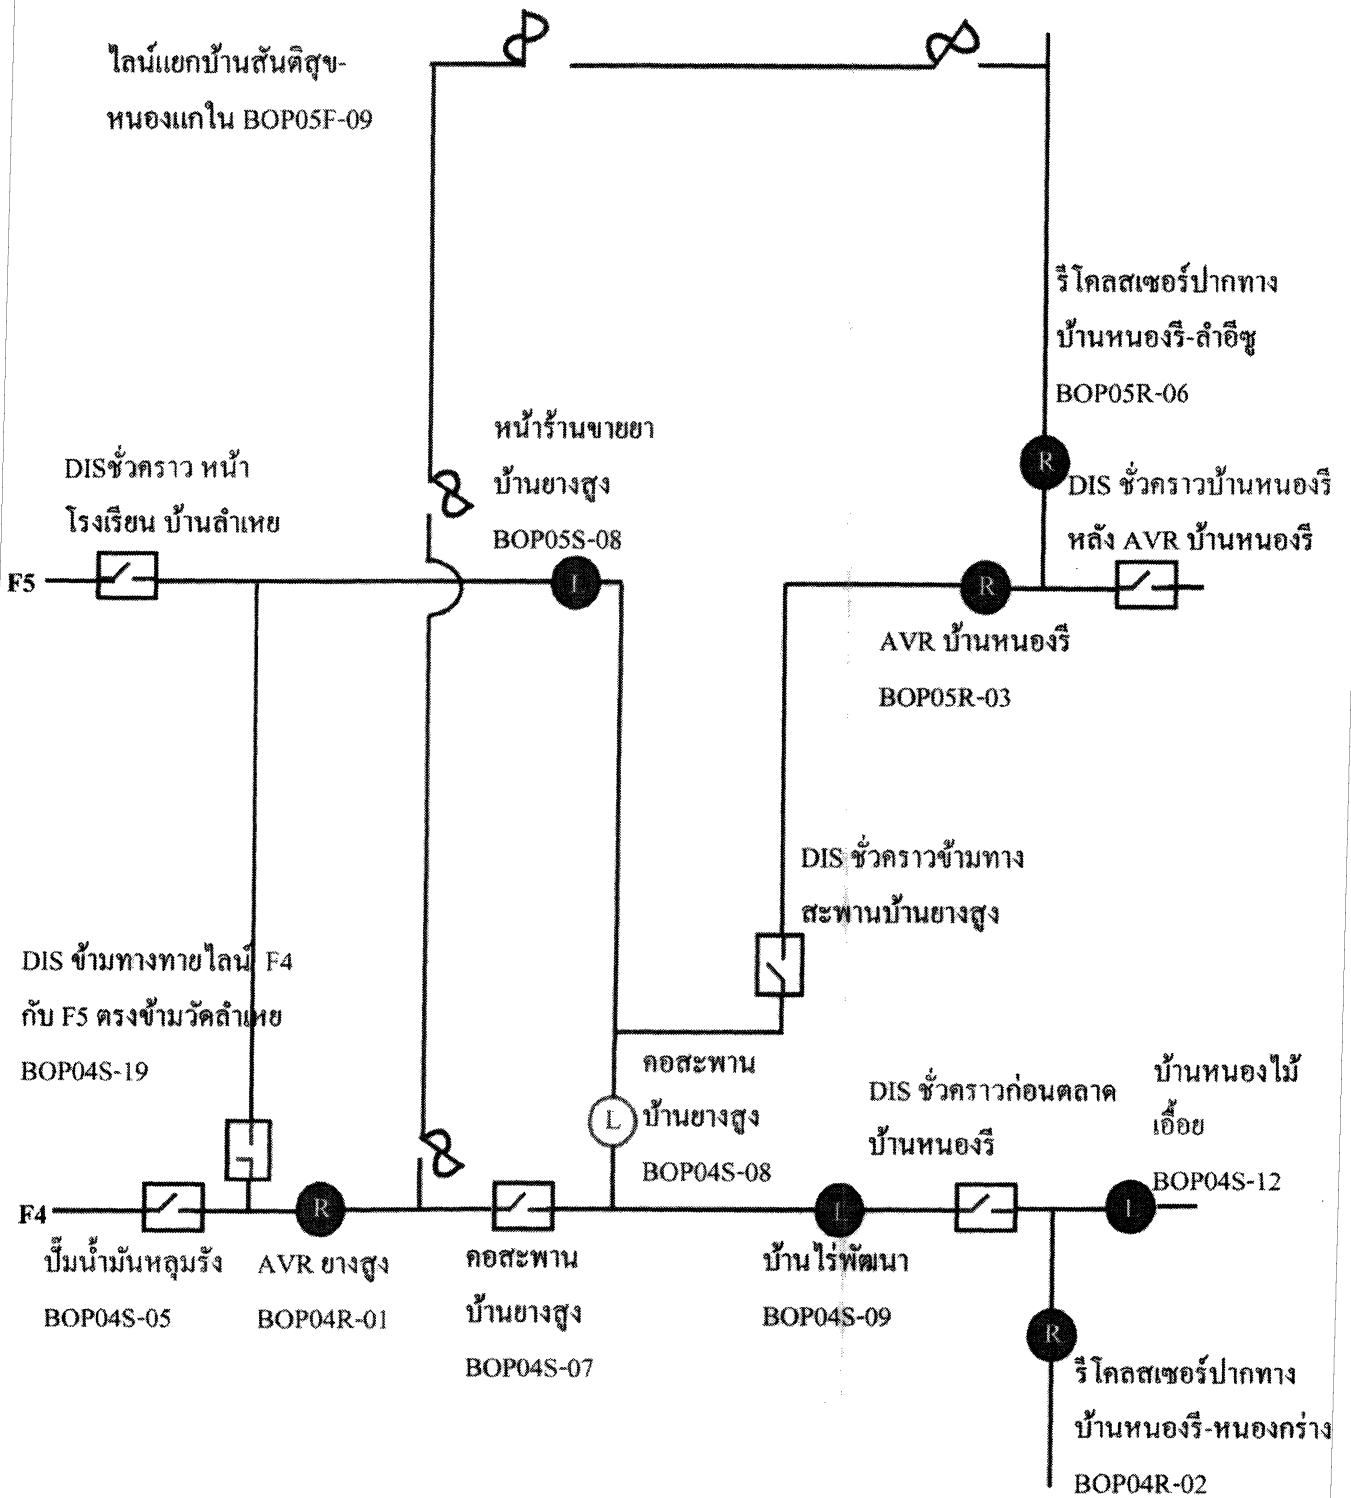


3 กอ.62

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

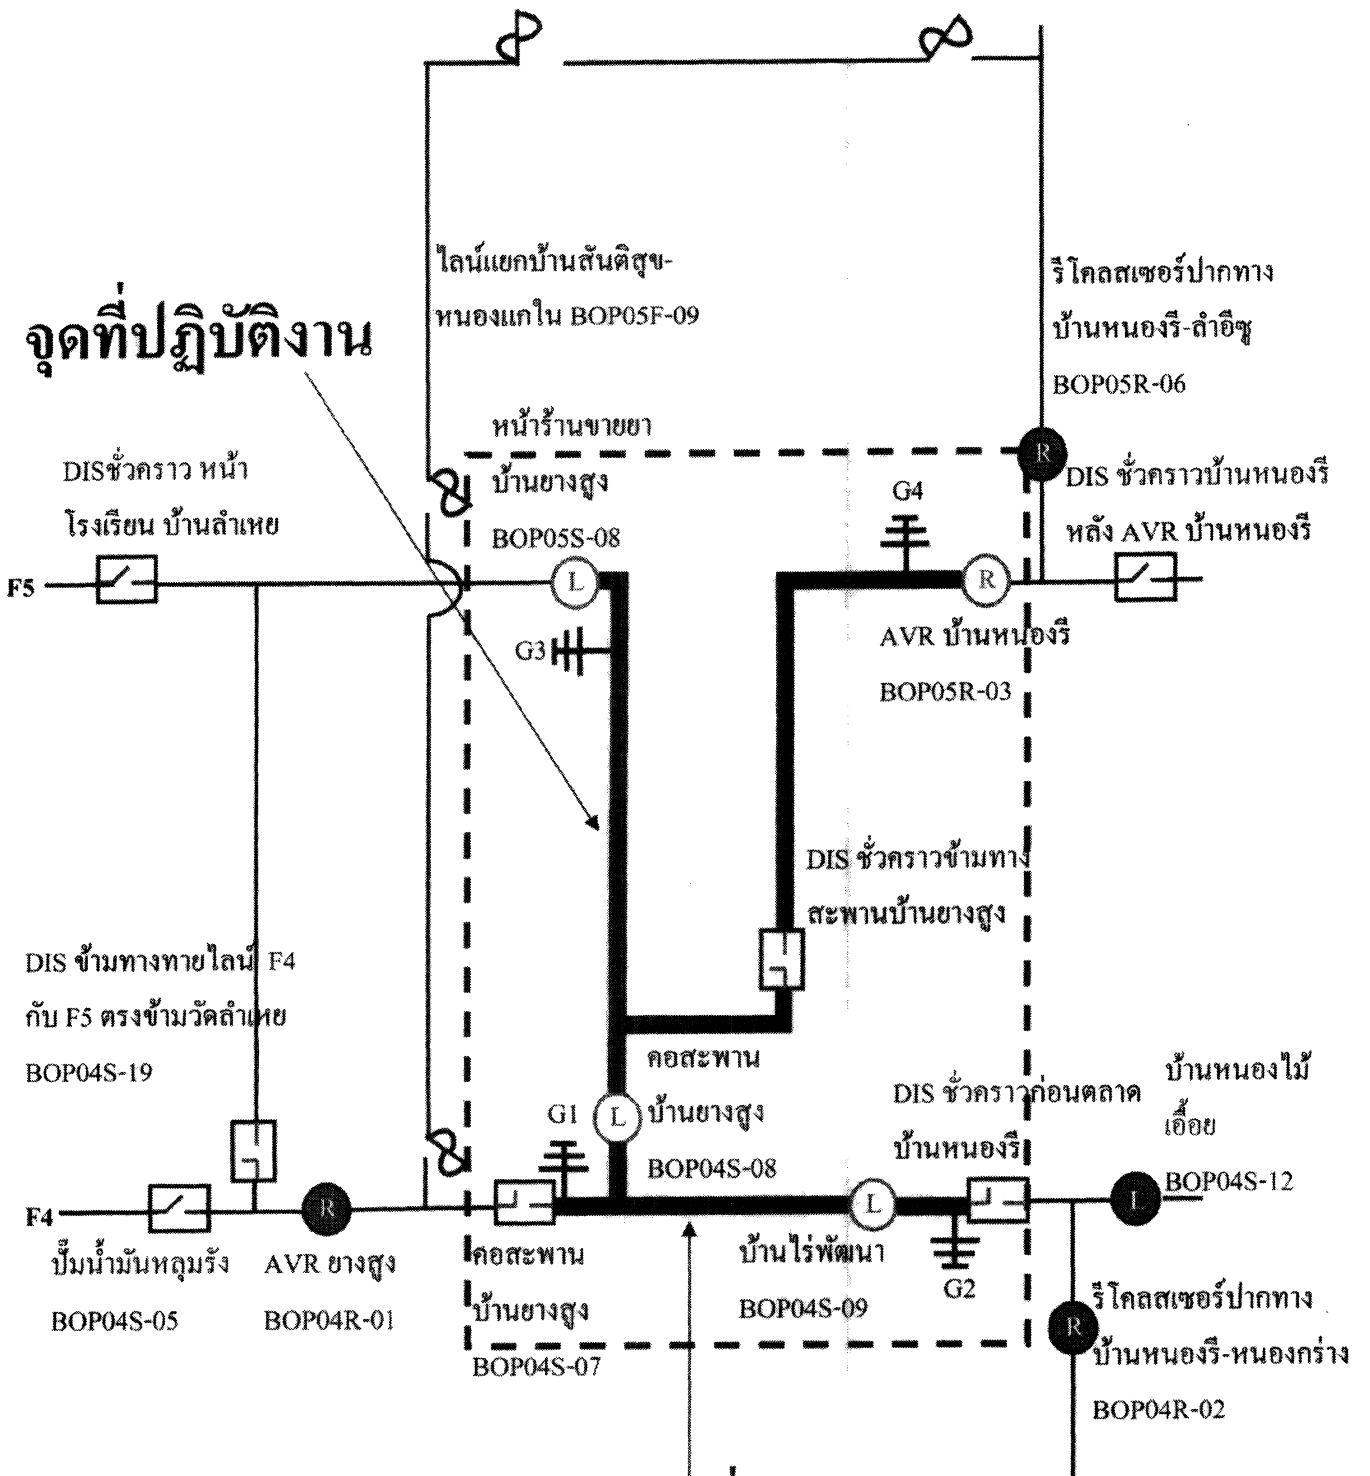

จุดที่ปฏิบัติงาน

จุดที่ปฏิบัติงาน

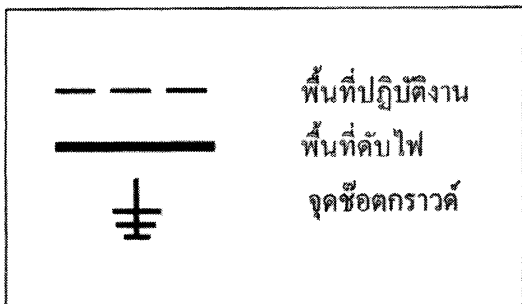

[Signature]
3 กค. 62
