

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.สค.(ป.บ.) ๓๒๐๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

1940

วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟพ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒  
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMG๐๓	๑๔ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ปากช. มหาชัยคอนกรีต ถึง บีม ปตท.	จุดตัดเบรก โดยวิธีฮอท ไลน์กระเช้า	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรบน	นายอนุช ฐุโชติ โทร ๐๘-๘๘๗๒-๙๖๔๕
๒	SMG๐๓	๑๔ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรบน	SMG๓S-๑๐	
๓	SMG๐๒	๑๔ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรล่าง	SMG๒S-๐๙	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากช. มหาชัยคอนกรีต ถึง บีม ปตท.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอ้วนจ.เทียนทอง ตำแหน่ง ผ.บ.บ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟพ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SME03 จาก DDC เคบจิมโปท. ถึง Dis ไวอรา รัมโปท. (ขม)  
ในวันที่ 14 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 978

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SME03 จาก Dis ไวอรา รัมโปท. (ขม) SME35-10  
ในวันที่ 14 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SME02 จาก Dis ไวอรา รัมโปท. (ขม) SME2S-09  
ในวันที่ 14 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันดีเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทยอโง เทียนทอง  
6 ก.ค. 62  
กจ

สมพร ตันดีเกษตรกิจ  
( อดก. 6 ชม นว.ฉพ. )

สำหรับผู้อนุมัติ **1940**

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.สอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)  
**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น  
ผจพ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

 - 8 ก.ค. 2562

(นางสาวอรุณา ตักดีพนา)

ชก.ปป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ปากซอยมหาชัยคอนกรีต   |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 14-ก.ค.-62  | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟจ.สค.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 978/62   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ  |          | วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 6 ก.ค. 62   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 8 ก.ค. 62   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |          | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	SMA02VB-01	Auto	Manual		SMA		โหลด 6.4 MW
3	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG	-	-
4	SMG02VB-01	Auto	Manual		SMG		โหลด 1.8 MW
5	SMG03VB-01	Auto	Manual		SMG		โหลด 1.7 MW
6	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG	-	-
7	ย้ายโหลด SMG03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMG02						
8	SMG02S-10	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากซอยมหาชัยคอนกรีต (Loop line)
9	SMG03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากซอยมหาชัยคอนกรีต (บน)
10	ย้ายโหลด SMG02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMA02						
11	SMA02S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เยื้อง ช.เทศบาล 8
12	SMA02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
13	SMG02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากซอยมหาชัยคอนกรีต (ล่าง)
14	SMA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
16	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบับ ปตท. (บน)
17	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบับ ปตท. (ล่าง)
18	แจ้ง กฟจ.สค. โหลดหม้อแปลง						
19	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณเลยบับ ปตท.						
20	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณเลยบับ ปตท. แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค. ทราบ						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
26	SN1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
27	SMA02VB-01	Manual	Auto		SMA	-	-
28	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG	-	-
29	SMG02VB-01	Manual	Auto		SMG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SMG03VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
31	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
34	SN1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
35	SMA02VB-01	Auto	Manual		SMA		- -
36	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
37	SMG02VB-01	Auto	Manual		SMG		- -
38	SMG03VB-01	Auto	Manual		SMG		- -
39	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG		- -
40	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
41	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
42	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
43	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
44	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณเลยป้อม ปตท.						
45	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณเลยป้อม ปตท. แล้วเสร็จ						
46	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าป้อม ปตท. (บน)
47	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าป้อม ปตท. (ล่าง)
48	ย้ายโหลด SMG02 บางส่วน กลับคืนจาก SMA02						
49	SMA02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
50	SMG02S-09	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากขอยมหาชัยคอนกรีต (ล่าง)
51	SMA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
52	SMA02S-08	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 เยื้อง ช.เทศบาล 8
53	ย้ายโหลด SMG03 บางส่วน กลับคืนจาก SMG02						
54	SMG03S-10	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากขอยมหาชัยคอนกรีต (บน)
55	SMG02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากขอยมหาชัยคอนกรีต (Loop line)
56	SN1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
57	SMA02VB-01	Manual	Auto		SMA		- -
58	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
59	SMG02VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
60	SMG03VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
61	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
สิ้นสุด Switching							

รศ.กษณะภากร ฟูฟ่องหมื่นปี วิศวกร

### มหาชัยคอนกรีต

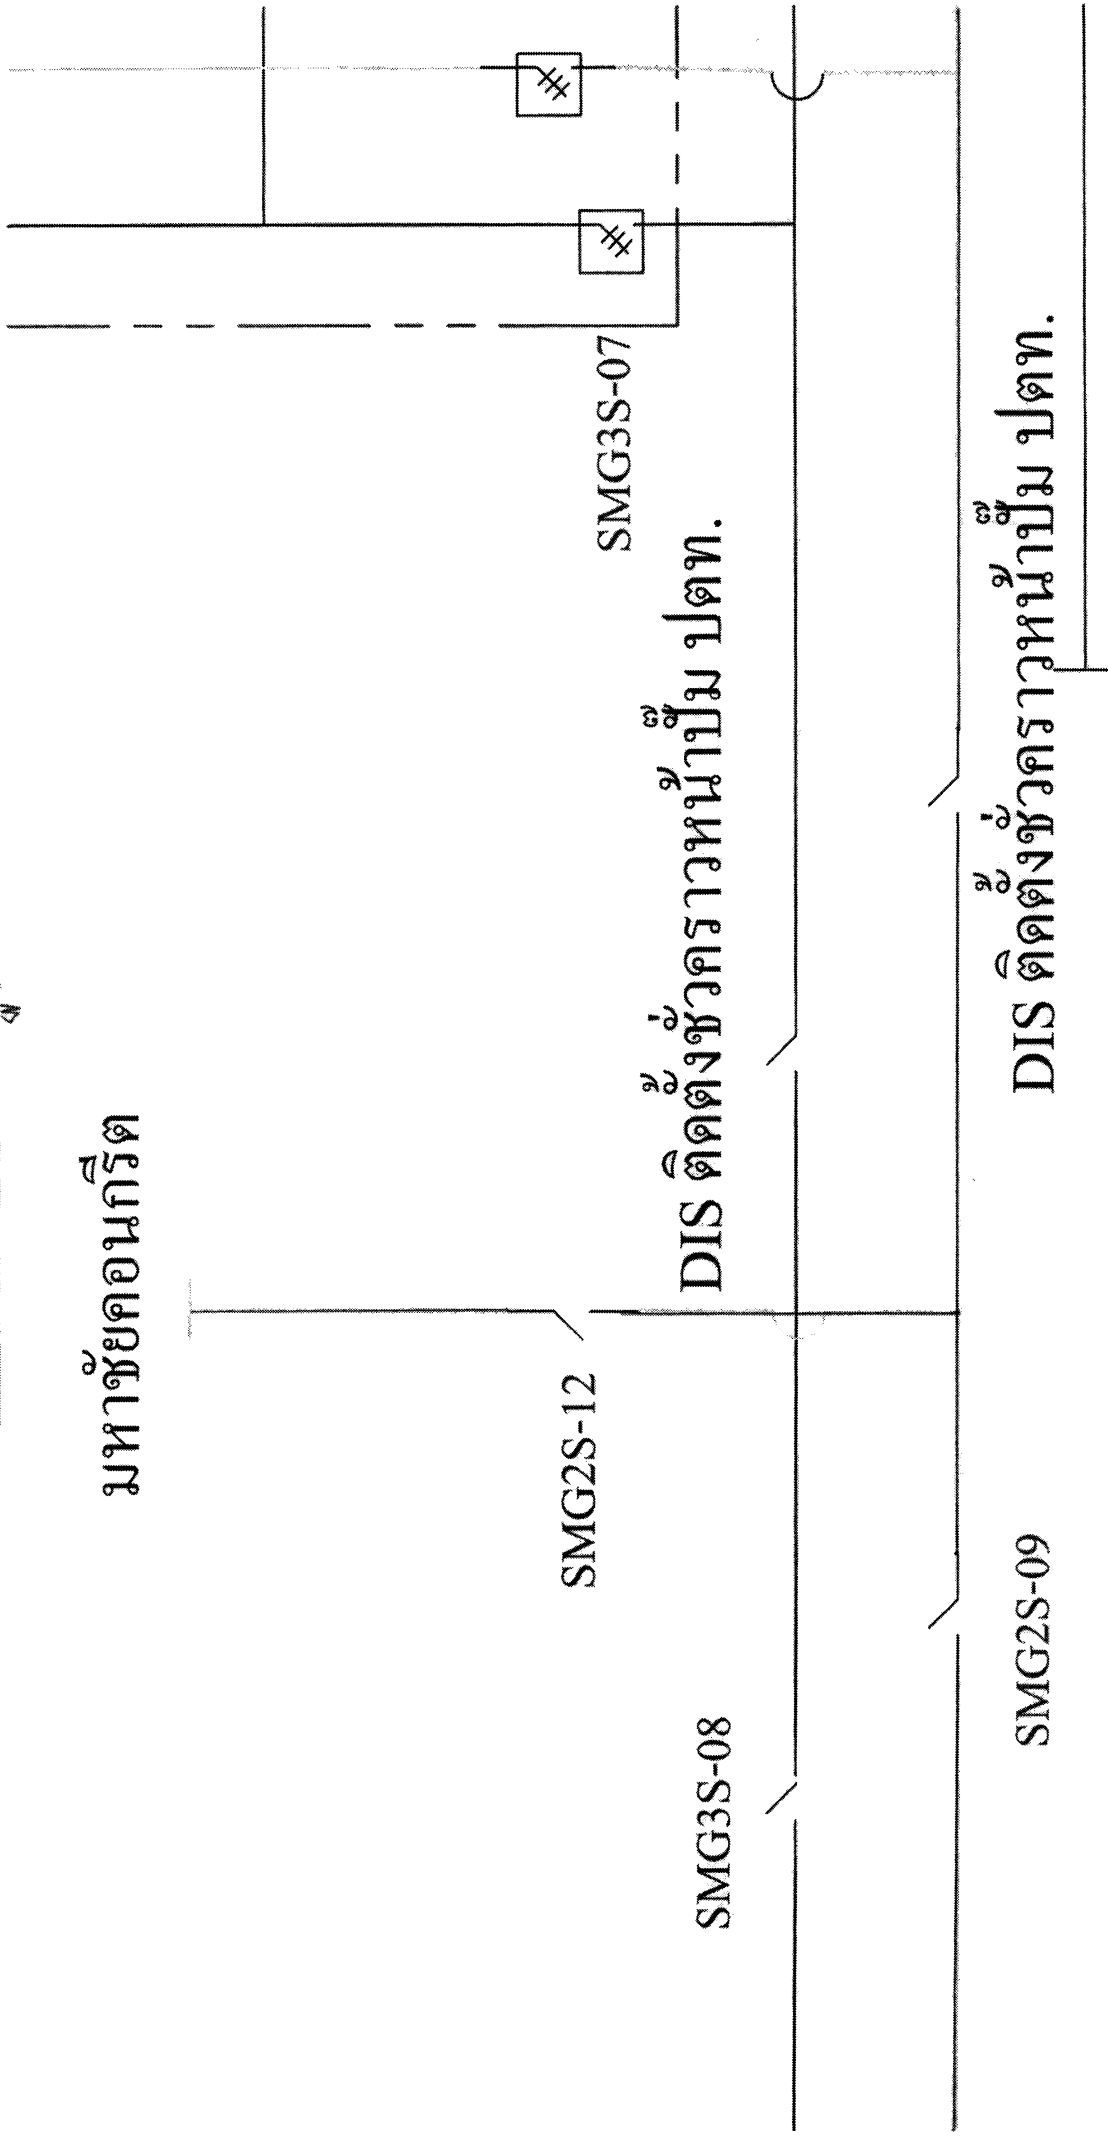

SMG2S-12

SMG3S-07

DIS ติดตั้งชั่วคราวปั๊ม ปตท.

SMG3S-08

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้าปั๊ม ปตท.

SMG2S-09

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

# มหาชัยคอนกรีต

