



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. ๓๒๕๒ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายคณิต งามโนธรรม

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต งามโนธรรม

1930

วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สค.ขึ้น๓

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTBo๙	๑๙ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ ปากช. รร.ฟลอลเล็ฟ ถึง กลางซอย	จุดปลัดสายโดยชุด เชื่อมสาย	Drop out fuse บริเวณ ปาก ช. รร.ฟลอลเล็ฟ	นายนิทัศน์ เตชะวันโต โทร ๐๙-๑๕๑๐-๕๕๕๕
๒	KTBo๙	๑๙ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Drop out fuse บริเวณ ปาก ช. รร.ฟลอลเล็ฟ	DIS ติดตั้งชั่วคราว กลาง ช.รร.ฟลอล เล็ฟ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากช. รร.ฟลอลเล็ฟ ถึง กลางซอย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉวีมาจ เทียนทอง.....ตำแหน่ง..... พ.บ.บ..... โทร..... ๐๙-๑๕๕๕-๕๕๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด



๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต งามโนธรรม)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟช.สค.ขึ้น๓



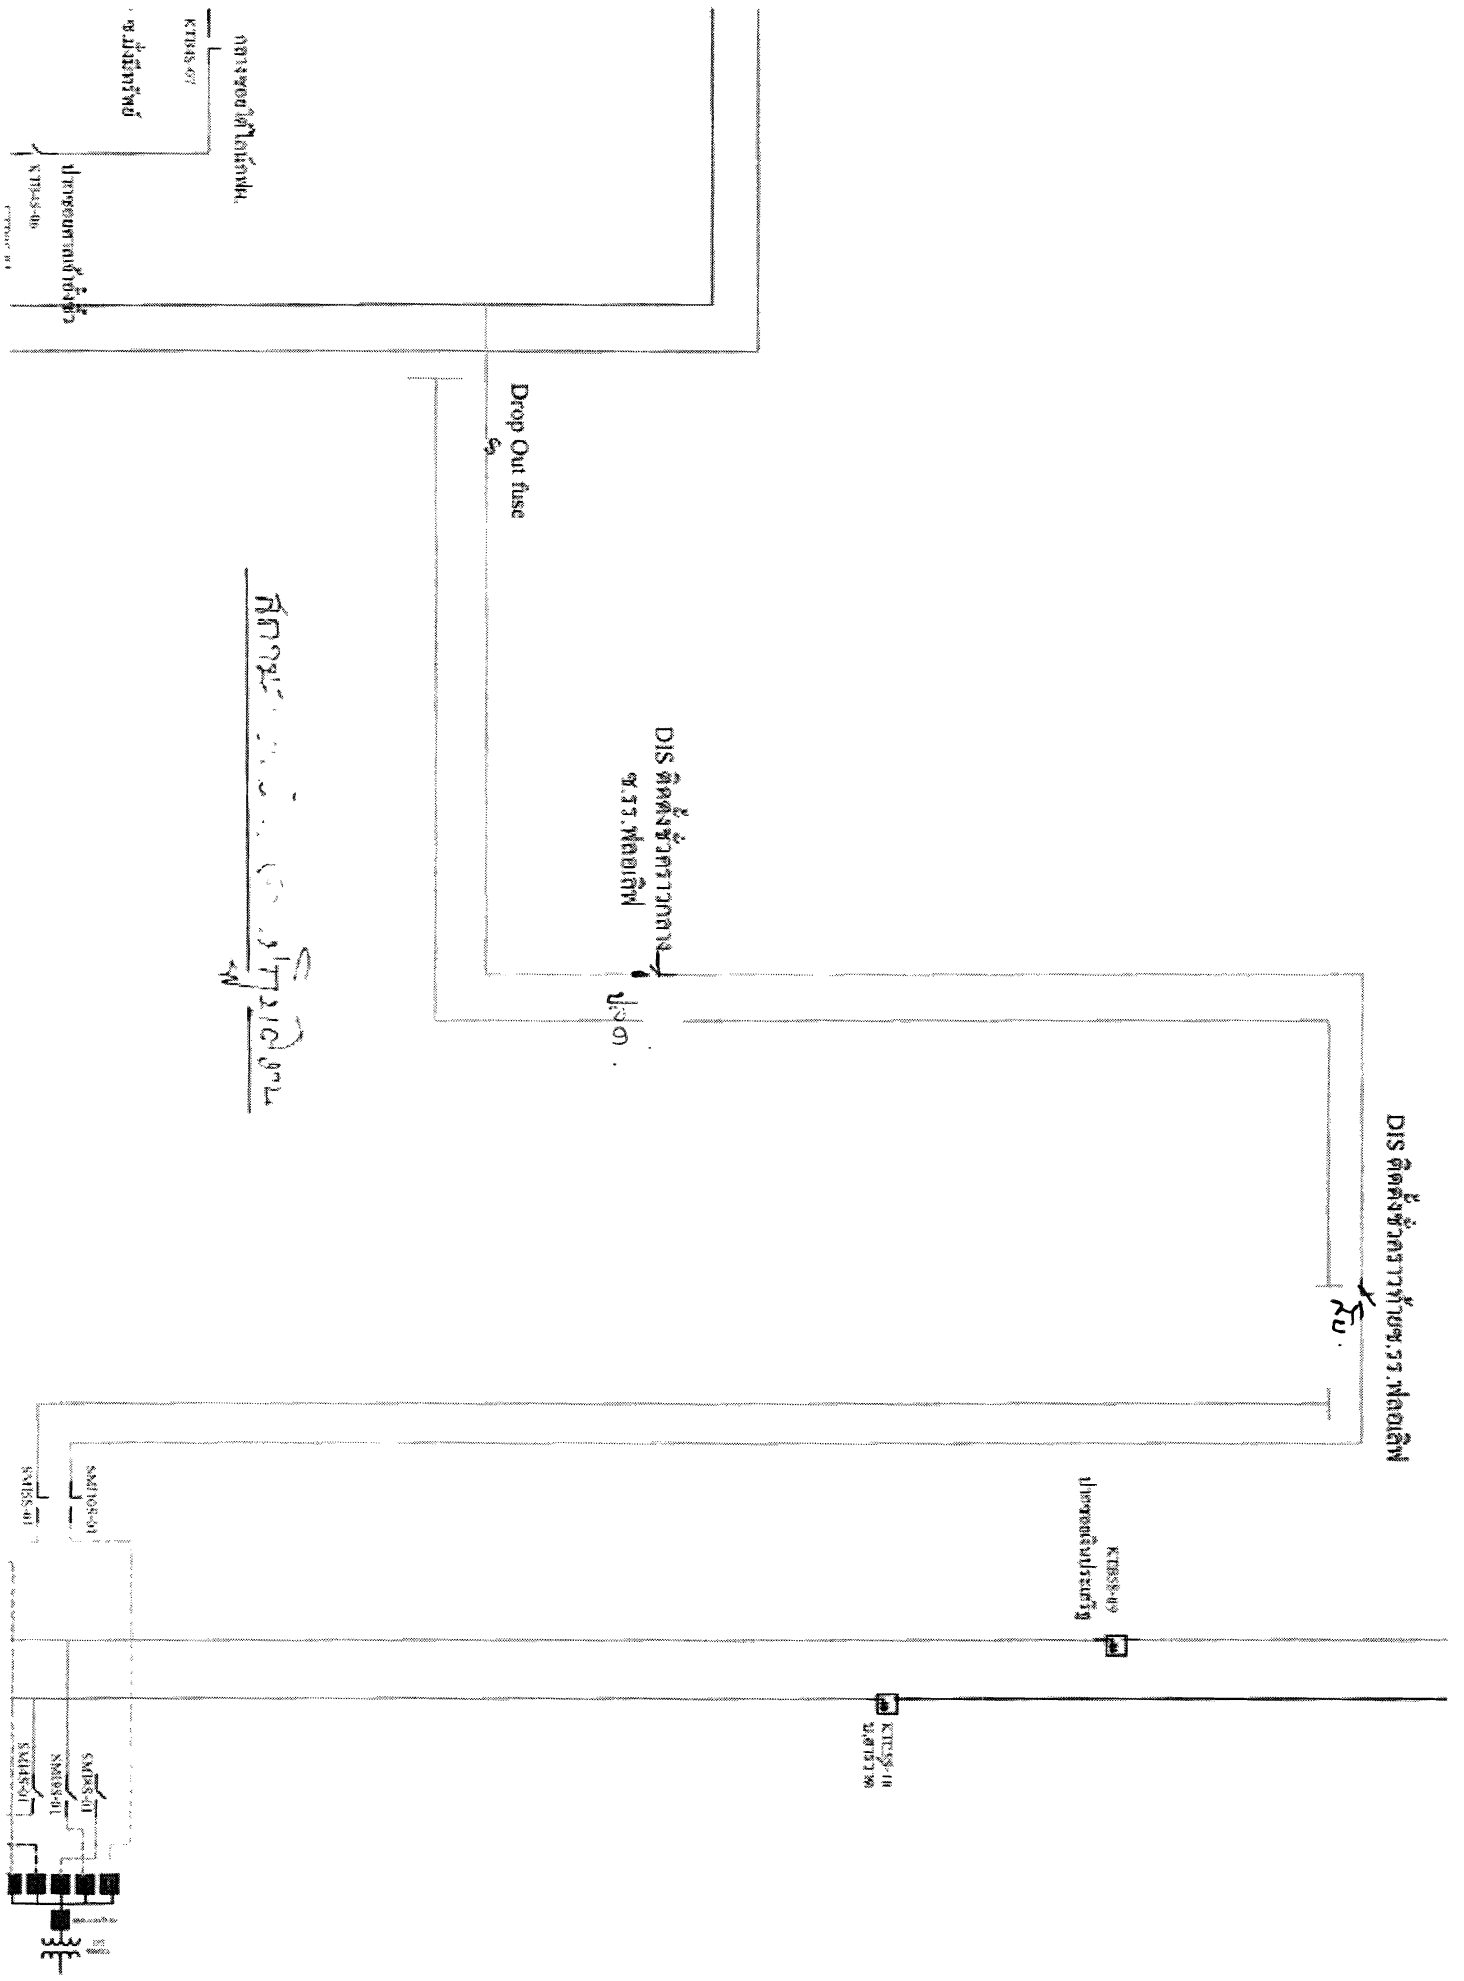
## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน                      จุดปลดสาย - Dis กลางซอย รร.ฟลอลีฟ
2. กำหนดวันที่ทำงาน                      14 ก.ค. 62                      ระหว่าง                      08.00 น.                      ถึง                      17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน                      สค.                      งานที่ทำ                      ปรับปรุงระบบจำหน่าย                      ตามใบขอปฏิบัติงาน                      985/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย                      นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์                      วันที่                      6 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย                                            วันที่                      6 ก.ค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย                                            วันที่                      8 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	เวลา 00.00 ของวันที่ 14 กค.62						
3	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB		
4	ย้ายโหลด KTB09 บางส่วนไปรับไฟจาก SMI10						
5	SMI10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Pothead F10
6	SMI10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		
7	DIS ชค.	สับ	ปลด		สค.		DIS กลาง ซอย.รร.ฟลอลีฟ
8	DIS ชค.	ปลด	สับ		สค.		DIS ท้าย ซอย.รร.ฟลอลีฟ
9	SMI10VB-01	Manual	Auto		SMI		
10	KTB09VB-01	Manual	Auto		KTB		
11	สิ้นสุด Switching ช่วงของวันที่ 13 กค.62						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching วันที่ 14 กค.62						
13	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB		
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
15	Dropout Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		D/O ปากซอย รร.ฟลอลีฟ
16	แจ้ง HL.กฟง.สค.ทำการปลดจุดจัมสายออกทั้ง 3 เฟสได้						
17	แจ้ง HL.กฟง.สค.ทำการปลดจุดจัมสายออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟง.สค.ทราบ						
21	KTB09VB-01	Manual	Auto		KTB		
22	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของวันที่ 14 กค.62						
23	เมื่อชุด กฟง.สค.แล้วเสร็จ						
24	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB		
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
27	แจ้ง HL.กฟง.สค.ทำการปลดเชื่อมจุดจัมสายเข้าทั้ง 3 เฟสได้						
28	แจ้ง HL.กฟง.สค.ทำการปลดเชื่อมจุดจัมสายเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	Dropout Fuse	ปกติ	สับ		สค.		D/O	ปากซอย รร.ฟลอลิฟ
30	KTB09VB-01	Manual	Auto		KTB			
31	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							





กรมช่างเทคนิค  
K1E5S-07

กรมช่างเทคนิค  
K1E5S-06

