เอกสารขอดับไฟ

เลขที่ รับ-ส่ง วิทยุ _____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้รับ นายชัยวัฒน์ ดำเนินศิลป์ ตำแหน่ง อก.ปบ.ก.1
ชื่อผู้ส่ง นาย ชัยวัฒน์ ดำเนินศิลป์ ตำแหน่ง ผอ.ก.วิศวกรรม
วันที่ 25 พ.ย. 62

วันที่ _____
เวลา _____
ชื่อผู้รับเอกสาร _____
ชื่อผู้ส่งเอกสาร _____

ที่ กฟภ.(กป) จตาต่อไปนี้
ด้วย กฟฟ. วิศวกรรมสาย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า 115 อ่างทอง 2 ดังนี้

ที่	วงจร	ว.ด.ป.	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	สถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	ผู้ประสานงานการดับไฟ
1	115KV	2,3 ธ.ค. 62	09.00	16.00	ซ่อมแซมระบบ 115 KV	อก.2 - เสม่า	สมศักดิ์ ดงนิ่ง	สมศักดิ์ ดงนิ่ง
2	115KV	4 ธ.ค. 62	09.00	16.00	และตัดต้นไม้ใหญ่	อก.2 - บางน้ำเชี่ยว	สมศักดิ์ ดงนิ่ง	สมศักดิ์ ดงนิ่ง

0 66-516-9227

๑. พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) _____

๒. ผลกระทบกับระบบสื่อสาร

๒.๑ ☑ มีแนวไฟเบอร์ ออฟติค ใต้ไลน์ ☐ ไม่มีแนวไฟเบอร์ ออฟติค ใต้ไลน์
☐ มีโอกาสชำรุด ☑ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.๒ สำนักงาน กฟฟ.หน้างาน
☑ ไม่ได้รับผลกระทบไฟดับ ☐ ได้รับผลกระทบไฟดับ

จึงขอยนุมัติดับไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย

ลงชื่อ (นายชัยวัฒน์ ดำเนินศิลป์)
ผจก.กฟฟ.วิศวกรรมชั้นชำนาญ

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๑

เรียน อก.ปบ.ก.๑

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๑ พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก ATB3YB-02,03 ถึง SNA3YB-01
ในวันที่ 2,3 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ตามใบสั่งทำสวิตช์ซึ่งเลขที่ 028/ธ-ก-62

☑ อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก ATB3YB-01,02 ถึง BAM2YB-01
ในวันที่ 4 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ตามใบสั่งทำสวิตช์ซึ่งเลขที่ 028/ธ-ก-62

☐ ไม่อนุมัติให้ทำงานตามคำขอข้อ _____ โดย/เนื่องจาก _____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตช์ซึ่ง (ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟทราบด้วย)
ที่ ก.๑ กปบ. (ศฟ.)-๒๓๖๖/๒๕๖๒

เรียน ผจก.วิศวกรรมไฟฟ้า, ผจก.เสม่า, ผจก.ควบคุมแก้ว, ผจก.บังสิต, กฟก.3, สฟ.อิบทอง 2, สฟ.บางไทร, สฟ.บางกระสั้น

อนุมัติลงนามแล้ว

ลงชื่อ _____
(นายวิชาญ ตินทร์อยู่)
รก.ปบ.ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.๑
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

ลงชื่อ _____
(นายเฉลิมศักดิ์ บุญมิรัมดร์)
ชก.ศฟ.ปฏิบัติงานแทน ผศ.ศฟ.กปบ.ก.๑
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

กฟ.๑๑-ร.๒๕

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....028.../....ธ.ค.62.....

แผ่นที่.....5.....ของ.....6.....แผ่น

ที่	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	กฟฟ./สถานี	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	รหัสรถยนต์	ผู้ควบคุมงาน	หมายเหตุ
			วันที่ 4 ธ.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 115kV					
	ประสานศูนย์นนท์ขอขนาน สฟ.ไทรน้อย กับ สฟ. อ่างทอง2							
	นำโหลด สฟ.บางปลาม้า มารับไฟทาง สฟ.ไทรน้อย				แจ้งศูนย์นครปฐม			
1	Off Recloser Cut Off ATB3YB-01, BAM2YB-01, LBL1YB-01							
2	ตรวจสอบ BAM2YS-01,02 สถานะ " สับ "							
3	โหลดก่อนขนาน ATB3YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
4	โหลดก่อนขนาน LBL1YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
5	สับ	BAM4YB-01						
6	โหลดขณะขนาน ATB3YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
7	โหลดขณะขนาน LBL1YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
8	ปลด	BAM2YB-01						
9	โหลดหลังขนาน ATB3YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
10	โหลดหลังขนาน LBL1YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
12	On Recloser Cut Off ATB3YB-01, BAM4YB-01, LBL1YB-01							
	พร้อมดำเนินการ							
1	Off Recloser Cut Off ATB3YB-01							
2	ปลด	ATB3YB-01,02						
3	ปลด	ATB3YS-01,02,03						
4	ปลด	BAM2YS-01,02			แจ้งศูนย์นครปฐม			
5	ใช้ Voltage Detector ตรวจสอบแรงดันจุดปฏิบัติงาน				ชื่อผู้ตรวจสอบแรงดัน			
6	ทำกราวด์หัว-ท้ายจุดปฏิบัติงาน				ชื่อผู้ทำกราวด์			
7	On recloser cut off BSA1YB-01							
	หลังดำเนินการ							
1	ปลดกราวด์จุดปฏิบัติงาน				ชื่อผู้ปลดกราวด์			
2	Off recloser cut off BAM4YB-01							
3	สับ	BAM2YS-01,02						
4	สับ	ATB3YS-01,02,03						
5	สับ	ATB3YB-01,02						
6	On Recloser Cut Off ATB3YB-03, BAM4YB-01							

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....028.../....ธ.ค.62.....

แผ่นที่.....6.....ของ.....6.....แผ่น

ที่	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	กฟฟ./สถานี	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	รหัสรถยนต์	ผู้ควบคุมงาน	หมายเหตุ
			วันที่ 4 ธ.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 115kV					
	ประสานศูนย์นนท์ขอขนาน สฟ.ไทรน้อย กับ สฟ. อ่างทอง2							
	นำโหลด สฟ.บางปลาม้า มารับไฟทาง สฟ.ไทรน้อย				แจ้งศูนย์นครปฐม			
1	Off Recloser Cut Off ATB3YB-01, BAM2YB-01, LBL1YB-01							
2	ตรวจสอบ BAM2YS-01,02 สถานะ " สับ "							
3	โหลดก่อนขนาน ATB3YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
4	โหลดก่อนขนาน LBL1YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
5	สับ	BAM2YB-01						
6	โหลดขณะขนาน ATB3YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
7	โหลดขณะขนาน LBL1YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
8	ปลด	BAM4YB-01						
9	โหลดหลังขนาน ATB3YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
10	โหลดหลังขนาน LBL1YB-01 .....MW, ...Mvar Ia.....Ib.....Ic.....							
12	On Recloser Cut Off ATB3YB-01, BAM4YB-01, LBL1YB-01							

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟพระนครศรีอยุธยา พิจารณา

เตรียมการสวิชชิ่ง โดย...นายภาณุวัฒน์ ปรีชญานาท.....ลงชื่อ.....วันที่.....25 พ.ย. 62....

ตรวจสอบสวิชชิ่ง โดย...นายอภิชาติ อ่างรัมย์.....ลงชื่อ.....วันที่.....25 พ.ย. 62.....

หัวหน้าแผนก โดย.....ลงชื่อ.....วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

อนุมัติสวิชชิ่ง โดย.....(นายวิชาญ อินทรอยู่).....ลงชื่อ.....วันที่.....

สั่งทำสวิชชิ่ง โดย.....รก.ปน.ปฏิบัติงานแทน อก.ขบ.น.๑.....ลงชื่อ.....วันที่.....

เอกสารแนบ 1

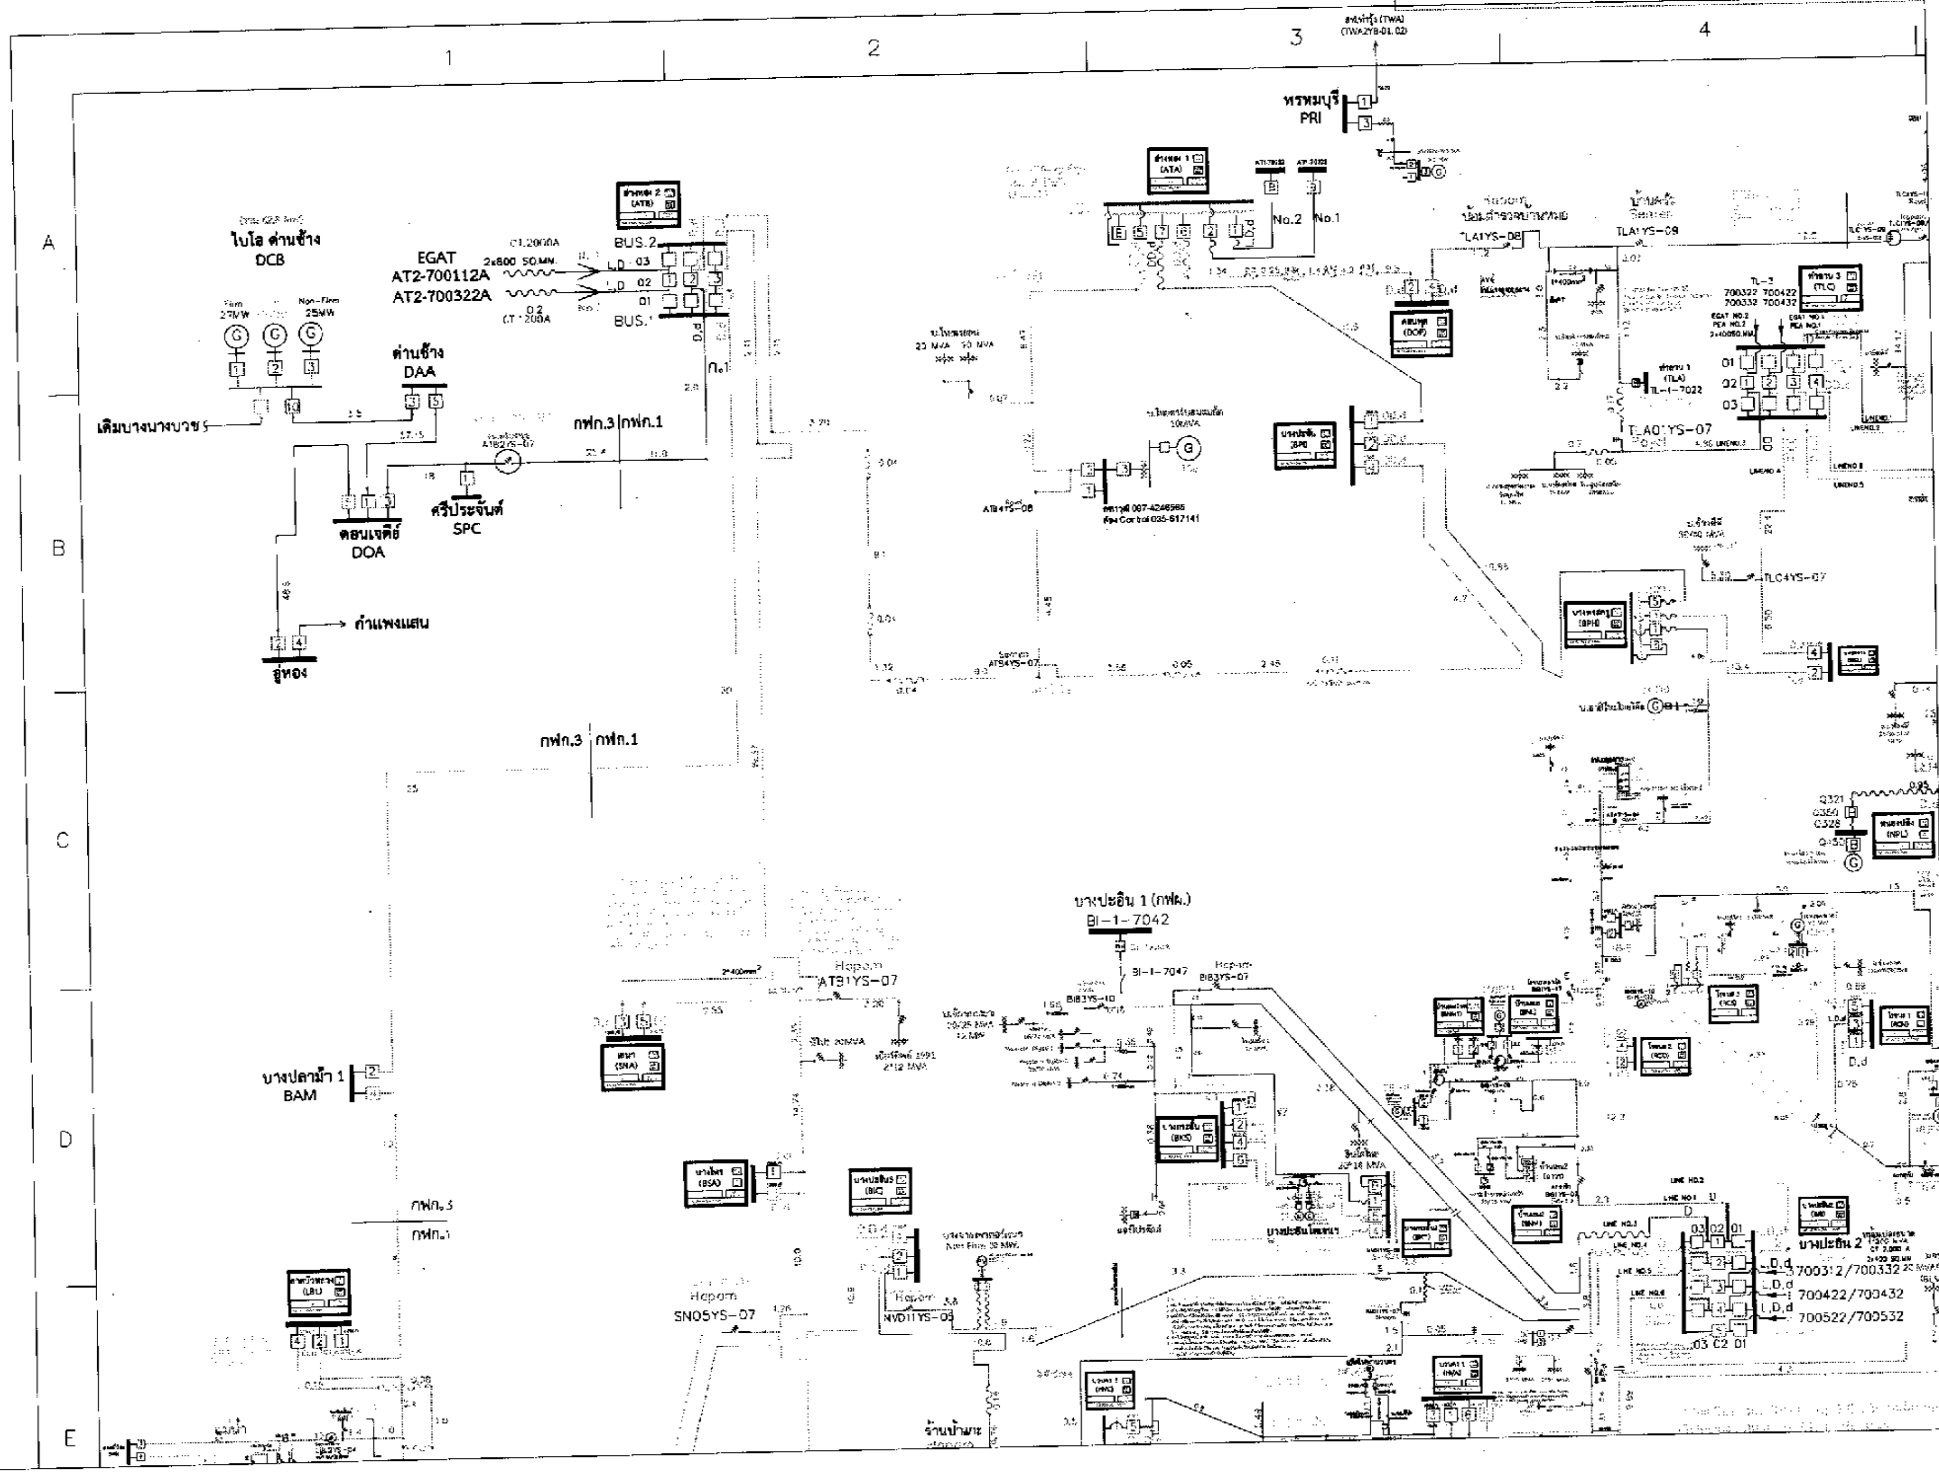
ใบโอ ด่านช้าง
DCB
EGAT
AT2-700112A
AT2-700322A
BUS.2
BUS.1
ด่านช้าง
DAA
เติมบางนางบวช
กฟก.3 กฟก.1
ดอนเจดีย์
DOA
ศรีประจันต์
SPC
กำแพงแสน
อู่ทอง
หรหมบุรี
PRI
No.2
No.1
TLA1YS-08
TLA1YS-09
TLA0YS-07
TLC4YS-07
บางปะอิน 1 (กฟผ.)
BI-1-7042
BI-1-7047
บางปลาม้า 1
BAM
บางปะอิน 2
700312/700332
700422/700432
700522/700532
